
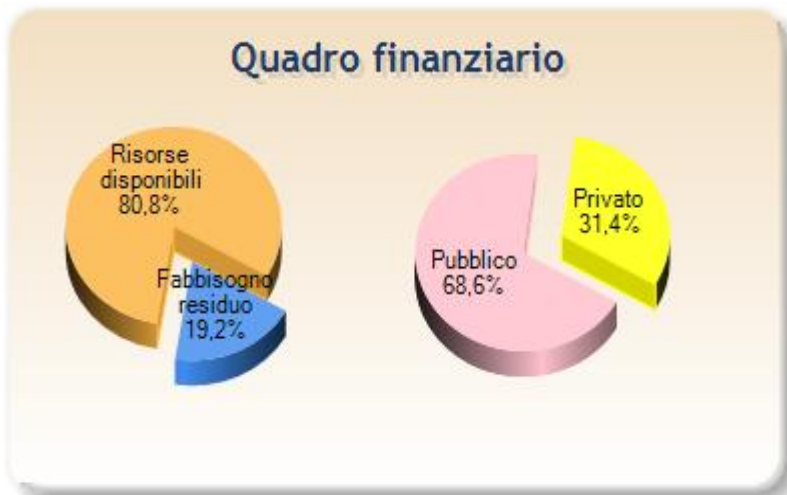


HUB INTERPORTUALI

Hub interportuale di Catania

SCHEMA N. 141

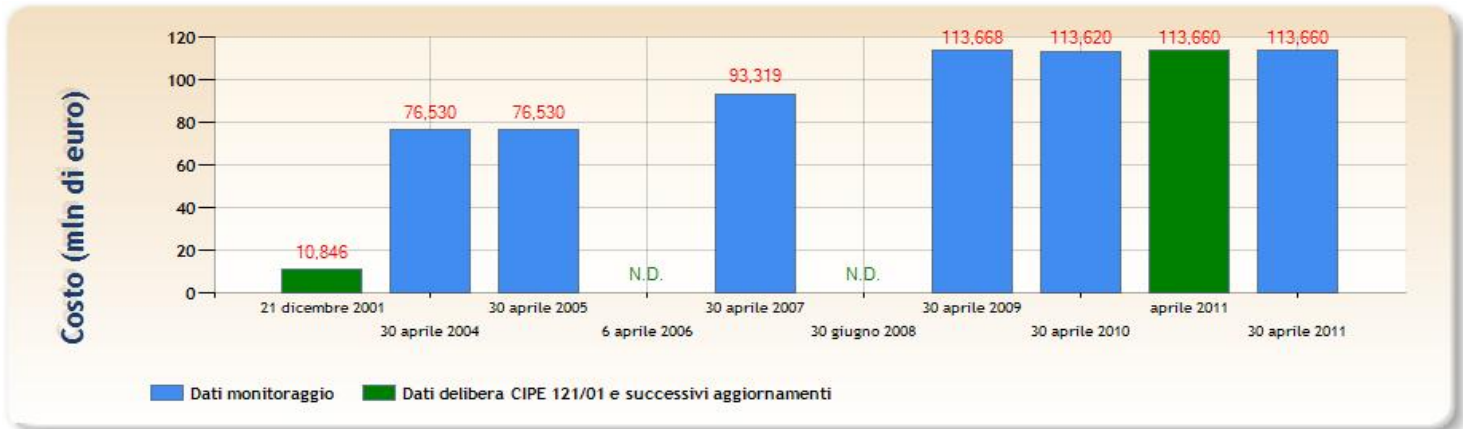

LOCALIZZAZIONE



CUP:

H31H03000160001

TIPOLOGIA OPERA:

Interporti

SOGGETTO TITOLARE:

Interporti Siciliani Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

75/2003
103/2006

ULTIMAZIONE LAVORI

Oltre 2015

DESCRIZIONE

Il progetto relativo alla realizzazione dell'interporto di Catania 1^ fase si compone di 2 stralci per complessivi 5 lotti funzionali:

- 1° Stralcio

Area di sosta polo logistico

Polo logistico

Polo intermodale

- 2° Stralcio

Polo intermodale completamento

Strada di collegamento

L'analisi di dettaglio del percorso attuativo è stata pertanto condotta anche in modo distinto per ciascuno di essi.

Il progetto complessivo dell'Interporto di Catania prevede interventi su due diverse aree, designate dal Comune di Catania, collegate da una bretella viaria di 1.860 m, di cui la prima (polo intermodale) a ridosso della stazione scalo merci di Bicocca, l'altra (polo logistico) nell'Area Sviluppo Industriale (ASI).

In particolare, sull'area denominata "polo intermodale" sono previsti servizi di supporto allo stoccaggio temporaneo delle merci ed alla loro movimentazione nel passaggio dalla modalità su gomma alla modalità su ferro mentre sull'area denominata "polo logistico" sono previsti servizi relativi alla ristrutturazione dei cicli di assemblaggio di merci finite.

Il progetto prevede 2 stralci funzionali:

- il primo riguarda la realizzazione delle opere relative al "polo logistico" ed al "polo intermodale", con l'eccezione, per quest'ultimo, di due magazzini, nonché agli allacci stradali e ferroviari;

- il secondo la realizzazione della bretella di collegamento tra le aree "polo logistico" e "polo intermodale" e dei due suddetti magazzini del "polo intermodale".

La progettazione definitiva ed esecutiva dell'Interporto di Catania 1^ fase funzionale è stata affidata, tramite gara, alla Società ITALFERR Spa, la quale ha sviluppato le indicazioni fornite dal progetto preliminare e, tenendo conto delle più recenti stime di traffico nell'orizzonte temporale 2005-2015, ha elaborato la nuova configurazione dell'infrastruttura proponendo una più netta specializzazione dei due poli nella logica di una migliore autonomia operativa che ne favorisse anche l'espandibilità futura.

DATI STORICI

1990

La legge n. 240 sull'intermodalità include l'Interporto di Catania tra gli interporti di interesse nazionale ammessi a finanziamento.

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito degli Hub interportuali.

2003

Si tiene la prima sessione della CdS.

La Interporto di Catania Spa e MIT firmano, a maggio, la convenzione per la realizzazione dell'opera.

Il MIT trasmette la relazione istruttoria sull'"interporto di Catania", proponendo un finanziamento di 21,7 Meuro a carico della legge 166/2002 da recuperare utilizzando parte delle risorse che la delibera n. 121 destina al "Ponte sullo Stretto di Messina".

Nella seconda sessione della CdS del 25 settembre la Regione Sicilia approva il progetto con modifiche e prescrizioni. Il CIPE, con delibera n. 75, prende atto che per la realizzazione dell'opera è previsto l'espletamento di gare d'appalto per 3 lotti funzionali e che il costo della 1^ fase dell'opera è aumentato a seguito del recepimento degli adeguamenti richiesti dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Il nuovo costo della 1^ Fase è di 76,5 Meuro e quello del primo stralcio funzionale è di 59,9 di cui 38,2 disponibili e 21,7 residui. Tra le disponibilità non risulta il contributo di 8,7 Meuro già assegnato al soggetto aggiudicatore ai sensi della legge n. 240/1990 poiché non è stato impegnato nei

termini previsti dal decreto-legge n. 194/2002. Il CIPE accoglie quindi la proposta di assegnazione di un contributo di 21,7 Meuro a carico delle risorse stanziare dalla legge n. 166/2002 con compensazione del maggiore onere con parte delle risorse programmaticamente riservate al "Ponte sullo Stretto di Messina". Il soggetto aggiudicatore è individuato nella società "Interporto di Catania Spa" e l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione dei mutui.

L'Interporto di Catania Spa pubblica il bando di gara per la realizzazione del 1° lotto funzionale dell'area di sosta polo logistico. L'importo dell'appalto è 4,5 Meuro e l'intervento si compone di lavori civili (1,7 Meuro) strade (1,2 Meuro) acquedotti (1,1 Meuro) impianti (0,5 Meuro). Fissa in 300 giorni il termine di esecuzione dei lavori e il 7 aprile 2004 il termine della presentazione della domanda. Il finanziamento proviene dalla legge n. 488/1999, fondi propri dell'Interporto Spa e banche.

L'opera interporto di Catania è inserita nell'IGQ tra Governo e Regione Siciliana sottoscritta il 14 ottobre.

2004

La società Interporto di Catania, soggetto aggiudicatore, in data 19 gennaio, assume la nuova denominazione Società degli interporti siciliani Spa. Il capitale sociale è di proprietà di enti pubblici per il 76,68% e, per statuto, deve mantenere la quota pubblica almeno al 51% per un periodo di 30 anni dalla data di costituzione.

2006

Il MIT, con nota del 21 marzo, trasmette al CIPE la relazione istruttoria dell'interporto di Catania.

Il CIPE, nella delibera n. 103, prende atto della nuova denominazione della società Interporto di Catania Spa, che il costo dell'intera opera in sede di approvazione del progetto definitivo è stato aggiornato in 94,1 Meuro con un fabbisogno residuo di 12,8 Meuro (fabbisogno rivalutato in 12 Meuro e quindi il valore complessivo dell'opera è stato nuovamente aggiornato in 93,3 Meuro) e che il MIT ha proposto di assegnare all'opera un contributo, pari al fabbisogno residuo, sottolineando la rilevanza strategica dell'opera negli scambi da/per la Sicilia e il bacino del Mediterraneo. Il CIPE delibera quindi la modifica della denominazione del soggetto aggiudicatore e la concessione del contributo di 12 Meuro.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS

Il 13 giugno viene stato inaugurato il lotto funzionale Area di Sosta nel Polo Logistico dell'Interporto

2008

Il CIPE, nella seduta del 2 aprile, prende atto delle mutate condizioni di costo, di copertura finanziaria e delle modalità di realizzazione dell'interporto di Catania".

Il 3 giugno la Società degli Interporti Siciliani pubblica sulla G.U.C.E. il bando di gara per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico dell'Interporto di Catania.

2009

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n.10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Interporti Siciliani Spa, in data 22 gennaio, procede all'esclusione dalla gara, relativa al Polo logistico, dei raggruppamenti temporanei al primo e secondo posto nella graduatoria provvisoria di gara, a seguito di note prefettizie interdittive nei confronti delle società, che non hanno superato il controllo antimafia.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Hub Interportuale Catania", articolata in due stralci, è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

La Società degli Interporti Siciliani Spa, il 19 ottobre, aggiudica in via definitiva l'appalto dei lavori relativi alla 1 fase, 1° stralcio funzionale, Polo Logistico all'impresa "Ing. Pio Guaraldo Spa".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Hub Interportuale Catania", articolata in due stralci, è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)". Inoltre il 1° stralcio è riportato nella tabella "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 10%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risultano completati i lavori relativi all'area di sosta e in corso (con inizio al 29/12/2010) quelli relativi al Polo logistico. Tutti gli altri interventi dispongono di progettazione esecutiva.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	10,846 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	76,530 Fonte: Delibera CIPE 75/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005	76,530 Fonte: Delibera CIPE 75/2003
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	93,319 Fonte: Delibera CIPE 103/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	113,668 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	113,620 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	113,660 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	113,660 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	91,830 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	91,830
Fondi Legge Obiettivo	33,703 Fonte: Delibera CIPE 103/2006
Fondi Pubblici	29,307 Fonte: DEF 2012-2014
Fondi Privati	28,820 Fonte: Delibera CIPE 103/2006

Fabbisogno residuo: 21,830

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^ fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Con la Delibera CIPE 103/2006 viene preso atto della suddivisione in stralci. Gli stralci sono composti dai lotti funzionali Area di Sosta, Polo Logistico, Polo Intermodale, Polo Intermodale completamento, Strada di Collegamento, per i quali si rimanda alle relative schede.

Progettazione esecutiva

CIPE:	No
Importo lavori:	77.460.555,36
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.140.336,83
Importo di aggiudicazione:	983.418,63
Nome aggiudicatario:	ITALFERR SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n. 240/1990

del 4 Agosto 1990

Convenzione prot. n.2249/ATM 245 A.S. Interporto di Catania Spa/MIT del Maggio 2003

Delibera CIPE 75/2003

del 29 Settembre 2003

IGQ tra Governo e Regione Sicilia del 14 Ottobre 2003

Bando di gara Interporto di Catania Spa del 27 Ottobre 2003

Aggiudicazione Interporto di Catania Spa del Luglio 2004

Delibera CIPE 103/2006

del 29 Marzo 2006

Bando di gara Interporti Siciliani Spa del 3 Settembre 2008

1[^] fase-1[°] stralcio funzionale

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note: Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1[^] fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Con la Delibera CIPE 103/2006 viene preso atto della suddivisione in stralci. Il 1[°] stralcio funzionale è composto dal lotto Area di Sosta del Polo Logistico, dal Polo Logistico, dal Polo Intermodale (escluso i magazzini intermodali). Per i dati dei suddetti lotti si rimanda alle relative schede.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 58.684.359,27
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 1.140.336,83
Importo di aggiudicazione: 983.418,63
Nome aggiudicatario: ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2013

Previsione al 30/04/2011 2013

Area di sosta polo logistico

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note: talferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^ fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Il progetto esecutivo è stato successivamente suddiviso in stralci. L'Area di Sosta nel Polo Logistico rappresenta uno di questi stralci funzionali computato dal progettista in lavori pari a euro 4480000.

Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 4.480.000,00

Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.140.336,83
Importo di aggiudicazione:	983.418,63
Nome aggiudicatario:	ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	06770620588
Data inizio:	30/01/2002
Data fine:	21/10/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Interporti Siciliani Spa
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	300 giorni
Data bando:	07/11/2003
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	19/07/2004
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Puglisi Costruzioni s.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	04371150824
Data contratto:	07/02/2005

Quadro economico:

Importo a base gara:	4.383.680,00
Importo oneri per la sicurezza:	96.320,00
Importo complessivo a base di gara:	4.480.000,00
Importo aggiudicazione:	3.690.816,64
Somme a disposizione:	1.535.760,52
Totale:	5.226.577,16
% Ribasso di aggiudicazione:	20,20
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	21/03/2005
Data effettiva fine lavori:	13/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	29/09/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	09/05/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	150
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	La seconda perizia di variante è stata approvata in diminuzione rispetto all'originario importo contrattuale. Sono stati ordinati lavori per danni di forza maggiore pari ad € 21719,89
Importo:	3.485.270,84
Importo oneri sicurezza:	96.902,02
Somme a disposizione:	2.433.587,66
Totale:	6.015.760,52
Note:	Nelle somme a disposizione è stato incluso l'importo relativo all'acquisizione delle aree dell'intero polo logistico.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2006
Previsione al 30/04/2011	2006

Polo logistico

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa

Note: Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^a fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Il progetto esecutivo è stato successivamente suddiviso in stralci. Il Polo Logistico rappresenta uno di questi stralci computato dal progettista in lavori pari a euro 29059366. Successivamente l'importo dei lavori è stato rideterminato dal RUP in euro 34103429 per aggiornamento dei prezzi unitari prima dell'invio del bando di gara ai sensi dell'art.1 comma 7 della L.R. n°20/2007.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 29.059.366,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 1.140.336,83
Importo di aggiudicazione: 983.418,63
Nome aggiudicatario: ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 23/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Interporti Siciliani Spa
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 30/05/2008
CIG/CUI: 0077572E6C
Data aggiudicazione: 19/10/2010
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Ing. Pio Guaraldo SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00196760268
Data contratto: 08/11/2010

Quadro economico:

Importo a base gara: 32.924.827,88
Importo oneri per la sicurezza: 1.178.601,37
Importo complessivo a base di gara: 34.103.429,25
Importo aggiudicazione: 23.219.600,60
Somme a disposizione: 8.040.845,75
Totale: 31.260.446,35
% Ribasso di aggiudicazione: 33,06
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 15/06/2013
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori: 29/12/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2013
Previsione al 30/04/2011	2013

Polo intermodale

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^ fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Il progetto esecutivo è stato successivamente suddiviso in stralci. Il Polo Intermodale rappresenta uno di questi stralci computato dal progettista in lavori pari a euro 25144993. Successivamente l'importo dei lavori è stato aggiornato in fase di validazione ai prezzi 2007 in euro 29404022.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 25.144.993,27
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 1.140.336,83
Importo di aggiudicazione: 983.418,63
Nome aggiudicatario: ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2013
Previsione al 30/04/2011	

1 ^ fase-2° stralcio funzionale

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^ fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Con la Delibera CIPE 103/2006 viene preso atto della suddivisione in stralci. Il 2° stralcio funzionale è composto dal lotto Polo Intermodale completamento (magazzini intermodali) e dal lotto Strada di Collegamento. Per i dati dei suddetti lotti si rimanda alle relative schede.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 18.776.196,09
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 1.140.336,83
Importo di aggiudicazione: 983.418,63
Nome aggiudicatario: ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2013
Previsione al 30/04/2011 Oltre 2015

Polo intermodale completamento

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^ fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Il progetto esecutivo è stato successivamente suddiviso in stralci. Il Polo Intermodale completamento (realizzazione dei magazzini intermodali) rappresenta uno di questi stralci computato dal progettista in lavori pari a euro 9755609,22. Successivamente l'importo dei lavori è stato aggiornato ai prezzi 2007 in sede di validazione in euro 11409775.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 9.755.609,22
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 1.140.336,83
Importo di aggiudicazione: 983.418,63
Nome aggiudicatario: ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	2006
Previsione al 30/04/2007	2006
Previsione al 30/04/2009	2006
Previsione al 30/04/2010	2013
Previsione al 30/04/2011	Oltre 2015

Strada di collegamento

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Italferr SpA ha eseguito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intero progetto Interporto di Catania 1^a fase funzionale; il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dalla Commissione Regionale (Sicilia) Lavori Pubblici in data 25/09/2003. Il progetto esecutivo è stato successivamente suddiviso in stralci. La strada di collegamento rappresenta uno di questi stralci computato dal progettista in lavori pari ad euro 9020587. Successivamente l'importo dei lavori è stato aggiornato ai prezzi 2007 in euro 11242840.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 9.020.586,87
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 1.140.336,83
Importo di aggiudicazione: 983.418,63
Nome aggiudicatario: ITALFERR SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 06770620588
Data inizio: 30/01/2002
Data fine: 28/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:

Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005 2006
Previsione al 30/04/2007 2006

Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2006
2013
Oltre 2015
