


SCHEMI IDRICI

BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo

SCHEDA N. 157

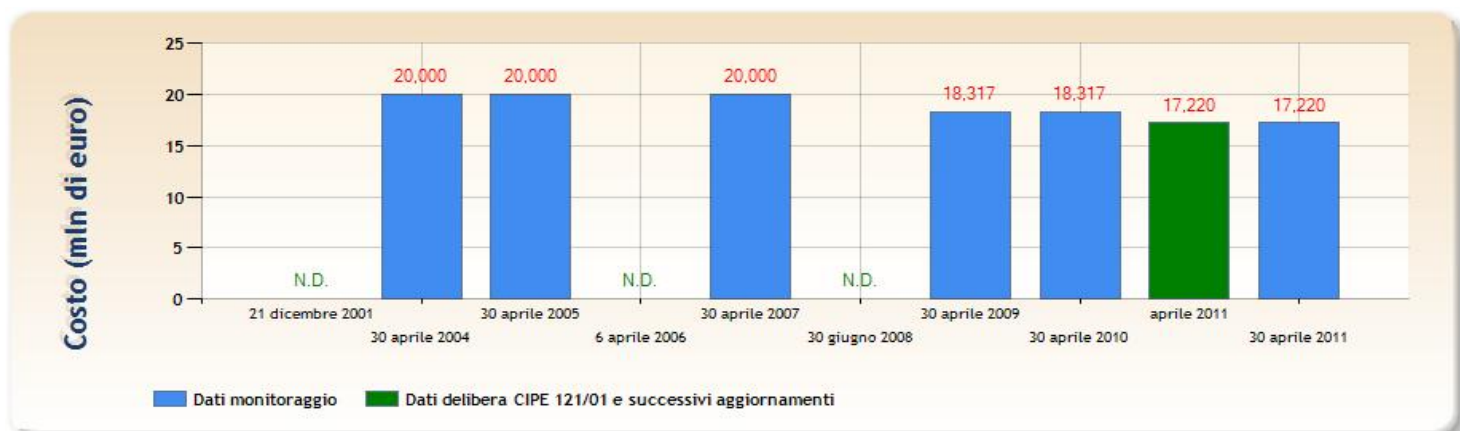

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G87H02000020001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

138/2002
54/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

2010

DESCRIZIONE

L'opera comprende la ristrutturazione, l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dell'adduttore del Sinni dalla diga di Monte Cotugno a Monteparano e la realizzazione di un sistema di telecontrollo e telegestione, con recupero di efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica. L'intervento è tuttavia funzionalmente indipendente dal previsto potenziamento dell'adduttore del Sinni.

DATI STORICI

1999

Nell' Accordo di Programma del 5 agosto tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici si individuano le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due Regioni e le infrastrutture da realizzare.

2001

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

Le OPCM n. 3187 e n. 3188 del 22 marzo stabiliscono che gli interventi già inseriti in accordi di programma ex art. 17 della legge n. 36/1994 e nelle intese istituzionali Stato-Regioni, nonché gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale, devono essere compresi in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la crisi idrica.

Con la nota del 18 dicembre, il MIT trasmette la relazione istruttoria sul "Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo", proponendo un finanziamento di 18,4 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002.

La Regione Puglia e il MIT sottoscrivono, l'11 dicembre, un accordo attuativo per la ristrutturazione e telecontrollo dell'esistente adduttore del Sinni individuando quale soggetto aggiudicatore la regione Basilicata.

Il CIPE, con la delibera n. 138, prende atto che il progetto preliminare dell'opera, già approvato, è disponibile a livello di definitivo e che l'intervento non necessita di VIA, in quanto la ristrutturazione della Canna del Sinni è già in esercizio. La Regione Basilicata, soggetto aggiudicatore, indica un costo previsto di 20 Meuro, di cui 1,6 per il sistema di telecontrollo, oggetto di specifica richiesta al MEF a carico dei fondi ex art. 141 della legge n. 388/2000. Quindi il finanziamento proposto, a valere sui fondi di cui alla legge n. 166/2002 è di 18,4 Meuro. Il CIPE assegna all'"Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo" l'importo complessivo di 18,4 Meuro in termini di volume di investimento articolati in 10 Meuro per l'anno 2003 e 8,4 per l'anno 2004. L'importo sarà erogato all'approvazione definitiva del progetto esecutivo e previa verifica dell'effettivo costo dell'intervento.

Il 20 dicembre il Presidente del Consiglio, i Ministri competenti e il presidente della Regione Basilicata sottoscrivono l'intesa generale quadro in cui si include l'"adduttore del Sinni" tra le opere previste dal PIS.

2003

Il CIPE, con delibera n. 63, indica la Regione Basilicata quale soggetto autorizzato a contrarre il mutuo per l'opera in questione.

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), il 16 dicembre, pubblica il bando di gara per l'aggiornamento dell'impianto di telecontrollo esistente che prevede la sostituzione delle apparecchiature di acquisizione/trasmissione dati presso le stazioni periferiche ed il centro di telecontrollo di Ginosa (TA) e la gestione provvisoria per un anno. L'importo d'appalto è di 1,1 Meuro di cui 0,3 quali oneri per la sicurezza. Si fissa in 450 gg. il termine di esecuzione.

L'EIPLI, il 16 dicembre, pubblica il bando di gara per progettazione definitiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di ammodernamento e adeguamento in materia di sicurezza dell'adduttore del Sinni dalla diga di Monte Cotugno a Monteparano. L'importo a base d'appalto è di 15,6 Meuro, di cui

14,9 per lavori soggetti al ribasso d'asta, 0,6 per la sicurezza e 0,8 per la progettazione esecutiva. Il termine d'esecuzione è di 1095 gg., dei quali 60 gg. per la redazione del progetto esecutivo.

2004

Il MIT, con nota del 6 aprile, richiede la variazione del soggetto aggiudicatore per l'intervento individuando, a tal fine, l'EIPLI in sostituzione della Regione Basilicata, su indicazione della stessa Regione.

L'EIPLI, in data 12 maggio, pubblica il bando di gara per l'affidamento dei lavori per la costruzione di un collettore di raccolta in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno e il ripristino dello stesso paramento in Agro di Sinise. L'importo a base d'appalto è di 1,1 Meuro ed il termine d'esecuzione è di 180 gg.

L'EIPLI, in data 13 luglio, aggiudica la gara relativa ai lavori per la costruzione di un collettore di raccolta in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno e il ripristino dello stesso paramento in Agro di Sinise.

Il CIPE, con delibera n. 54, individua nell'EIPLI il soggetto aggiudicatore.

2006

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

In data 1 giugno vengono pubblicati nella GU gli esiti dei seguenti appalti integrati: realizzazione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di ammodernamento e adeguamento in materia di sicurezza dell'adduttore del Sinni dalla diga di Monte Cotugno a Monteparano; aggiornamento dell'impianto di telecontrollo esistente, che prevede la sostituzione delle apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati presso le stazioni periferiche e presso il centro di telecontrollo di Ginosa (TA).

2008

Nel Rapporto Infrastrutture Prioritarie del MIT si rileva che per la copertura del finanziamento riguardante l'adduttore il mutuo è stato contratto dalla Regione, mentre per le opere di telecontrollo direttamente dall'EIPLI a valere sui fondi previsti dall'art. 141 della legge n. 388/2000. La gara, mediante appalto concorso, bandita dall'EIPLI, è stata aggiudicata per l'importo complessivo di 1,1 Meuro, oltre a 0,03 Meuro per oneri di sicurezza.

2009

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Ristrutturazione e telecontrollo adduttore Sinni" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010". Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Ristrutturazione e telecontrollo adduttore Sinni" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risultano conclusi i lavori relativi a tutti e tre i lotti che compongono l'opera.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001

Previsione di costo al 30 aprile 2004

20,000 **Fonte:** Delibera CIPE 138/2002

Previsione di costo al 30 aprile 2005

20,000 **Fonte:** Delibera CIPE 138/2002

Costo al 6 aprile 2006

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 130/2006

Previsione di costo al 30 aprile 2007	20,000 Fonte: Delibera CIPE 138/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	18,317 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	18,317 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	17,220 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	17,220 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	18,400 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	20,000
Fondi Legge Obiettivo	18,400 Fonte: Delibera CIPE 138/2002
Fondi Pubblici	1,600 Fonte: Delibera CIPE 138/2002

Fondi residui: **-2,780**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo di Programma n.36 Regioni Puglia e Basilicata

del 5 Agosto 1999

Ordinanze Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.3187 e 3188 del 22 Marzo 2002

Accordi di programma Regione Puglia del 11 Dicembre 2002

Delibera CIPE 138/2002

del 19 Dicembre 2002

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002

Delibera CIPE 63/2003

del 25 Luglio 2003

Bandi di gara del 16 Dicembre 2003

Delibera CIPE 54/2004

del 29 Settembre 2004

Avvisi di avvenuta aggiudicazione del 1 Giugno 2006

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria ammodernamento e adeguamento dell'adduttore del Sinni dalla diga Monte Cotugno a Monteparano

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Altro
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	1035 giorni
Data bando:	20/04/2004
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	22/11/2004
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Faver S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	02450340720
Data contratto:	05/04/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	14.935.745,28
Importo oneri per la sicurezza:	593.925,43
Importo complessivo a base di gara:	15.609.770,71
Importo aggiudicazione:	9.598.057,88
Somme a disposizione:	10.801.989,63
Totale:	20.400.047,51
% Ribasso di aggiudicazione:	40,25
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	13/03/2006
Data effettiva fine lavori:	30/11/2010
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	In ritardo - per variante dei lavori
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in via di definizione collaudo statico e tecnico-amministrativo

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 688
Motivi: Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 9.697.878,23
Importo oneri sicurezza: 621.675,43
Somme a disposizione: 8.080.446,34
Totale: 18.400.000,00
Note: sono in approvazione, da parte dei collaudatori, gli atti finali e i collaudi dei lavori

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2007
Previsione al 30/04/2005	2007
Previsione al 30/04/2007	2008
Previsione al 30/04/2009	2009
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2010

Collettore di raccolta in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni

Lavori: 180 giorni
Data bando: 24/12/2003
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 13/07/2004
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Scavi autotrasporti s.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 03341810103
Data contratto: 10/02/2005

Quadro economico:

Importo a base gara: 1.032.913,80
Importo oneri per la sicurezza: 36.151,98
Importo complessivo a base di gara: 1.069.064,78
Importo aggiudicazione: 978.501,29
Somme a disposizione: 258.171,11
Totale: 1.236.672,40
% Ribasso di aggiudicazione: 5,27
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 17/08/2004
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori: 17/08/2004
Data effettiva fine lavori: 14/03/2005
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Emesso certificato di regolare esecuzione in data 19/10/2005

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:

Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2005
Previsione al 30/04/2011 2005

Adeguamento del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore del Sinni

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione preliminare
CIPE: No
Importo lavori: 1.601.016,36
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 1.601.016,36
Data inizio: 30/11/2001
Data fine: 24/12/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Altro
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Preliminare
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 25 giorni
Lavori: 365 giorni
Data bando: 24/12/2003
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 05/10/2004
Tipo aggiudicatario: ATI

Nome aggiudicatario: ABB energy automation s.p.a
Codice fiscale aggiudicatario: 01725590168
Data contratto: 03/08/2006
Quadro economico:
Importo a base gara: 1.106.746,48
Importo oneri per la sicurezza: 31.483,21
Importo complessivo a base di gara: 1.138.229,69
Importo aggiudicazione: 1.021.500,00
Somme a disposizione: 544.102,61
Totale: 1.565.602,61
% Ribasso di aggiudicazione: 5,00
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 22/03/2006
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori: 22/03/2006
Data effettiva fine lavori: 10/08/2007
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo: 21/11/2008
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 145
Motivi: Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 1.222.257,33
Importo oneri sicurezza: 31.483,21
Somme a disposizione: 374.533,45
Totale: 1.628.273,99
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	2008
Previsione al 30/04/2005	2007
Previsione al 30/04/2007	2008
Previsione al 30/04/2009	2009
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2007
