


SCHEMI IDRICI

BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della

**Valle dell'Agri
1° lotto funzionale**

SCHEDA N. 159

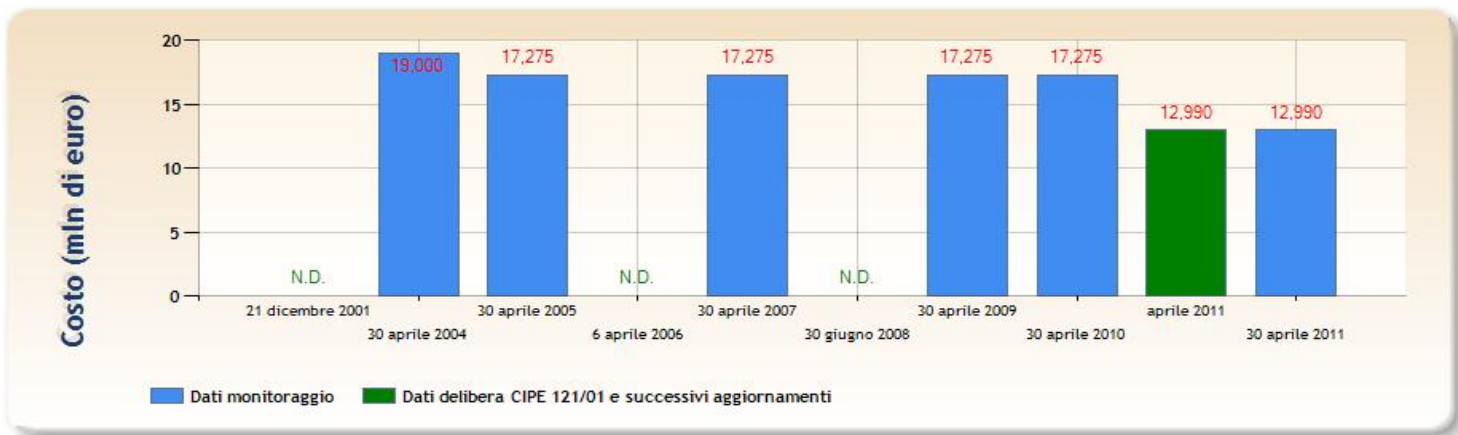

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G99J04000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Regione Basilicata

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori sospesi

DELIBERE CIPE

53/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

Al 31 maggio 2011 i lavori risultano sospesi

DESCRIZIONE

Il 1° lotto funzionale delle "Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri" comprende i seguenti lavori:

- sistemazione gruppo sorgentizio Oscuriello
- ripristino continuità idraulica di una tubazione esistente
- sistemazione area Montemurro
- aumento della capacità idrica di tre serbatoi
- rete idrica di Sant'Arcangelo
- rifacimento di vari partitori
- posa in opera di apparecchiature di controllo
- regolazione e misura dell'intero Acquedotto dell'Agri

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata.

2002

E' sottoscritta l'IGQ tra Governo e Regione Basilicata ove sono comprese le opere idriche dell'Agri.

2003

La Regione Basilicata, il 16 giugno, si esprime positivamente con prescrizioni.

Il RUP attesta che i manufatti non ricadono in aree sensibili e/o sottoposte a vincoli (attestazione del 9 luglio 2003).

Il MIT ha convocato la CdS che si conclude positivamente in data 24 novembre.

La Regione Basilicata, con nota del 2 dicembre, esprime parere di conformità in relazione alla localizzazione.

2004

Il RUP, in data 28 gennaio, dichiara concluso il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Nella nota del 23 febbraio, il MIT trasmette la relazione istruttoria sulle "Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie - 1° lotto funzionale", proponendo l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Il CIPE, con delibera n. 53, prende atto che l'opera è stata esclusa dalla procedura di VIA e che la Regione Basilicata ha trasmesso il progetto definitivo alle amministrazioni interessate ed agli enti gestori delle interferenze, i quali hanno rilasciato nulla osta di massima sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze. Il costo complessivo è di 17,3 Meuro, di cui 1,8 per IVA. Il CIPE approva il progetto definitivo e assegna alla Regione Basilicata l'importo complessivo di 17,3 Meuro a valere sulla legge n. 166/2002 (11 Meuro nell'anno 2005 e 6,3 nell'anno 2006).

2005

La società Acquedotto Lucano Spa, il 27 settembre, pubblica il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori delle opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - 1° lotto funzionale", per un importo complessivo dei lavori di 12,8 Meuro

2006

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Acquedotto Lucano Spa, in data 26 settembre, informa che è ancora in corso la fase di negoziazione.

2007

Il 6 aprile Acquedotto Lucano Spa aggiudica la gara all'Ati Marottoli Costruzioni e Servizi Srl; Ing.Ram Srl.

2009

L'opera compare nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1° lotto funzionale" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 58%).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva un avanzamento dei lavori del 68,20%. La conclusione è prevista per il 31 dicembre 2011, nonostante i lavori siano parzialmente sospesi.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	19,000 Fonte: Regione Basilicata
Previsione di costo al 30 aprile 2005	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2011
Previsione di costo al 30 aprile 2009	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Previsione di costo al 30 aprile 2010	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004
Costo ad aprile 2011	12,990 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	12,990 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	17,280 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	17,275
Fondi Legge Obiettivo	17,275 Fonte: Delibera CIPE 53/2004

Fondi residui:	-4,285
-----------------------	---------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	12.563.243,78
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	529.190,52
Nome aggiudicatario:	Acquedotto Pugliese SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00347000721
Data inizio:	
Data fine:	16/06/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Regione Basilicata
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	900 giorni
Data bando:	23/09/2005
CIG/CUI:	2029282879
Data aggiudicazione:	06/04/2007
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	A.T.I. MAROTTOLI Costruzioni e Servizi S.r.l. - Ing. RAM S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	01468210768
Data contratto:	21/09/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	12.177.558,70
Importo oneri per la sicurezza:	424.557,91
Importo complessivo a base di gara:	12.602.116,61
Importo aggiudicazione:	9.533.726,06
Somme a disposizione:	4.673.166,15
Totale:	14.206.892,21
% Ribasso di aggiudicazione:	30,47
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	31/12/2011
Stato avanzamento importo:	6.072.892,31
Stato avanzamento percentuale:	68,20

Data effettiva inizio lavori: 29/09/2008
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 3
Totale giorni sospensione:
Note: numero 1 sospensione totale di 93 giorni
numero 2 sospensioni parziali di cui 1 in corso

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002

Voto n. 344 CTAR Regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità del 16 Giugno 2003

Attestazione n.2286/8013 del 9 Luglio 2003

Delibera CIPE 53/2004

del 29 Settembre 2004

Bando di gara Acquedotto Lucano Spa del Settembre 2005

Avviso di aggiudicazione Acquedotto Lucano Spa del Settembre 2007
