



SCHEMI IDRICI

PUG - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III Lotto

SCHEDA N. 162

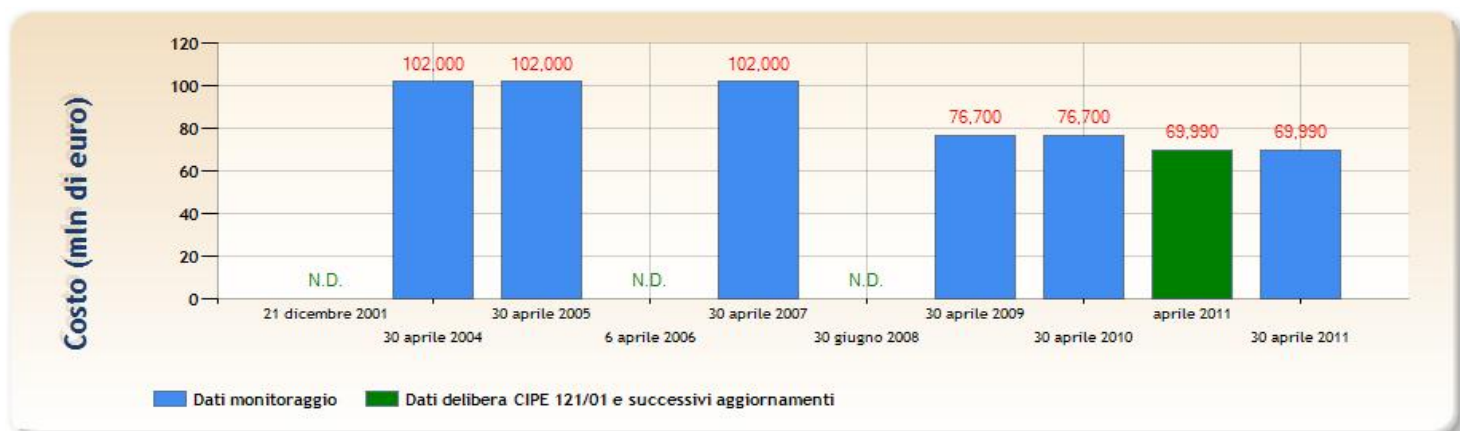

LOCALIZZAZIONE

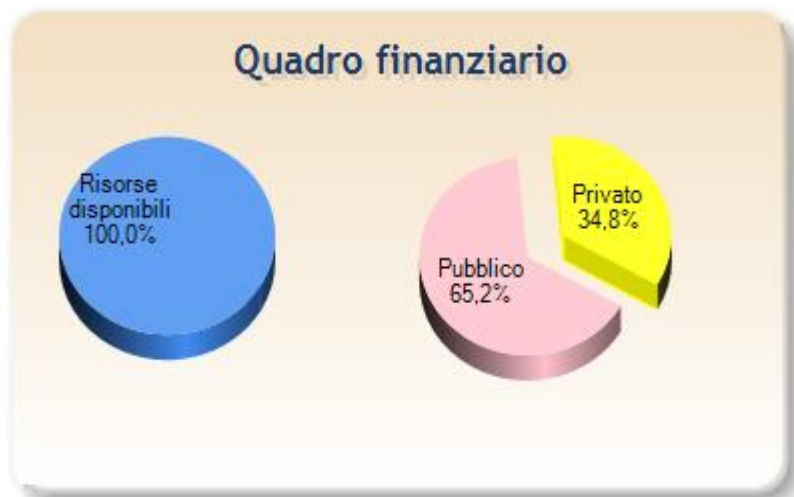

CUP:

E71B05000050003

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Acquedotto Pugliese Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

72/2007
91/2010

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Gli interventi riguardano un 1° stralcio funzionale dell'Acquedotto del Sinni, che - in derivazione dall'esistente acquedotto del Pertusillo - convoglierà una portata di circa 1,5 mc/s a servizio del Salento. Il completamento dell'acquedotto avverrà con la realizzazione dei potabilizzatori di Statte e di San Paolo, il cui progetto preliminare è in corso di predisposizione. Lo stralcio funzionale è articolato in 3 lotti:

- 1° lotto: adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo, di ca. 23,7 Km, con tubazione in acciaio del DN 1200;
- 2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo in agro di Salice Salentino in calcestruzzo armato del tipo seminterrato, della capacità di circa 50.000 m3 e posto nelle vicinanze dell'esistente serbatoio, di ca. 18.000 mc, ma ad una quota superiore per alimentare anche il suddetto attuale serbatoio;
- 3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli, di ca. 36,5 Km con tubazione in acciaio del DN 1400.

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra gli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Puglia.

2002

Gli interventi sono compresi nel "piano d'ambito" della Regione Puglia approvato con decreto del 30 settembre dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale Regione Puglia.

La Regione Puglia sottoscrive, il 30 settembre, con l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (AP Spa) la convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato (SII) nel suddetto A.T.O. Puglia.

2003

Gli interventi sono in parte ricompresi nell'APQ-Risorse idriche sottoscritto l'11 marzo.

L'opera è inclusa nell'IGQ Governo-Regione Puglia del 10 ottobre, che individua il Commissario delegato quale "soggetto attuatore della progettazione" e l'AP S.p.A. quale "aggiudicatore dell'appalto dei lavori".

2004

I progetti preliminari dei 3 lotti vengono approvati dal Commissario delegato per l'emergenza idrica in Puglia in via meramente tecnica, con decreti del 1° marzo 2004.

L'Acquedotto Pugliese S.p.A., soggetto aggiudicatore, invia con nota del 20 dicembre, il progetto definitivo al Ministero dei trasporti e al MIT e lo inoltra ai soggetti interferenti.

2005

Il soggetto aggiudicatore, tra gennaio e maggio, fa pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità.

L'Assessorato bilancio e programmazione della Regione Puglia, con nota del 22 giugno, esprime parere favorevole sull'opera.

Nella CdS del 23 giugno sul progetto definitivo vengono acquisiti i pareri di vari enti.

Il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 24 settembre, ritiene di non assoggettare l'opera a VIA.

Il RUP, con nota del 17 ottobre, fornisce controdeduzioni alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità.

La Regione Puglia approva il progetto definitivo in linea tecnica con nota del 27 ottobre 2005.

2006

L'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ritiene non necessaria la VIA e rilascia contestualmente parere favorevole alla valutazione di incidenza, formulando alcune raccomandazioni che in seguito il MIT riterrà non accoglibili, in quanto comporterebbero una localizzazione dell'opera diversa da quella già approvata.

La delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS menziona i primi 3 lotti dell'"Acquedotto del Sinni".

L'Assessorato all'assetto del territorio della Regione Puglia, verificata la non interferenza dell'intervento con la pianificazione urbanistica e tenuto conto del parere favorevole delle amministrazioni comunali interessate, con nota

del 14 luglio, rilascia parere favorevole di massima sulla localizzazione urbanistica, subordinato all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica.

Il 31 ottobre viene stipulato l'Atto integrativo n. 1 all'APQ tra Regione e Ministeri delle infrastrutture, delle politiche agricole, dell'ambiente e dello sviluppo economico. In tale atto si conferma la validità del progetto "Acquedotto potabile del Sinni" e viene prevista la realizzazione del potabilizzatore di S.Paolo.

2007

La Giunta regionale, con delibera del 16 gennaio, rilascia l'attestazione di compatibilità paesaggistica, richiesta dall'Assessorato regionale all'assetto del territorio, ai fini del perfezionamento del parere sulla localizzazione urbanistica.

La Direzione regionale per i beni architettonici della Puglia esprime parere favorevole con prescrizioni.

L'Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia dichiara la completa copertura finanziaria dell'opera nell'ambito degli investimenti previsti nell'APQ.

La localizzazione dell'opera viene approvata dalla Regione il 16 giugno.

Il MIT, il 26 luglio, trasmette al CIPE l'istruttoria sul progetto definitivo proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto stesso, che comprende anche il Programma interferenze.

Il CIPE, con delibera n. 72, prende atto che gli enti interessati dall'esecuzione delle opere hanno espresso pareri favorevoli e i necessari nulla osta e che solo il Consorzio speciale di bonifica di Arneo ha formulato alcune osservazioni che sono state ritenute non accoglibili. Approva quindi, con prescrizioni, il progetto definitivo dei 3 lotti. Il costo complessivo dell'intervento è di 76,7 Meuro al netto dell'IVA; la copertura economica sarà assicurata nel seguente modo:

- il 1° lotto (del costo di 22 Meuro, inserito nel richiamato 1° Atto integrativo dell'APQ "Risorse idriche") trova copertura nelle economie di detto APQ, di cui 6,6 Meuro a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia con delibera n. 84/2000, a valere sui fondi per le aree depresse recati dalla legge n. 488/1999; 9,5 a carico dei fondi POR Puglia e 5,9 dai fondi S.I.I. (fondi privati dell'Acquedotto Pugliese);

- il 2° lotto (del costo di 17,2 Meuro, inserito nell'APQ del marzo 2003 e nella rimodulazione del 16/6/05) è coperto, per 10,6 Meuro dai fondi POR Puglia e, per 6,5 dai fondi S.I.I.;

- il 3° lotto (del costo di 37,5 Meuro, inserito nell'APQ del marzo 2003 e nella rimodulazione del 16/6/05) è coperto, per 23,2 Meuro, dai fondi POR Puglia e, per 14,3 dai fondi S.I.I..

2008

Acquedotto Pugliese Spa, il 4 luglio, pubblica 2 distinti bandi di gara per l'affidamento dei lotti I e II.

2009

La Regione Puglia, con nota del 12 febbraio, comunica ad Acquedotto Pugliese Spa che, a seguito della perdita dell'aliquota dei finanziamenti comunitari, la Regione intende comunque dare attuazione al completamento dell'opera. L'opera è inclusa nella delibera CIPE n.10 sull'attuazione del PIS.

Acquedotto Pugliese Spa, il 19 marzo, aggiudica l'appalto integrato per i lavori di ampliamento del serbatoio di San Paolo in agro di Salice Salentino-Acquedotto del Sinni- II° Lotto all'Ati Intercantieri Vittadello Spa. e Antonio e Raffaele Giuzio.

A seguito di verifiche effettuate in cui sono state rilevate numerose interferenze, Acquedotto Pugliese Spa modifica parzialmente il tracciato originario del III° lotto. Il 30 luglio il nuovo progetto viene inviato per i pareri di competenza a tutti gli Enti interessati .

Con nota del 7 settembre, Acquedotto Pugliese Spa trasmette il nuovo progetto al MIT.

In data 28 settembre Acquedotto Pugliese Spa pubblica l'avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità su due quotidiani.

Il 6 novembre 2009 sottoscritto l'Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia. Nel documento non si fa riferimento agli schemi idrici.

2010

Il 22 aprile si svolge la CdS relativa alla variante del III lotto.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di

Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" articolata in 3 lotti: 1 lotto Condotta; 2 lotto serbatoio S.Paolo; 3 Lotto serbatoio di Secli.

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 91, approva l'aggiornamento del progetto definitivo, che prevede una variante del III lotto, consistente nella realizzazione di una condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio esistente di Secli. Le modifiche non comportano un aumento di costo.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera " Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori". Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" articolata in 3 lotti: 1 lotto Condotta; 2 lotto serbatoio S.Paolo; 3 Lotto serbatoio di Secli.

Nei primi giorni di giugno, Acquedotto Pugliese Spa pubblica il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione dell'Acquedotto del Sinni - III lotto, ovvero della condotta adduttrice dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Secli, ivi comprese le camerette di interconnessione con lo schema esistente e tutte le opere di linea di scarico e sfiato. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 25 luglio.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta il seguente avanzamento attuativo:

- lotto I, avanzamento lavori del 86% e ultimazione prevista per il 16 settembre 2011;
- lotto II, avanzamento lavori del 63%.e ultimazione prevista per il 10 novembre 2011;
- lotto III, bando di gara pubblicato il 3 giugno 2011, avvio dei lavori programmato per luglio 2012 e ultimazione prevista, dopo circa 2 anni, a giugno 2014.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	102,000 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Previsione di costo al 30 aprile 2005	102,000 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	102,000 Fonte: IGQ tra Governo e Regione Puglia
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	76,700 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
Previsione di costo al 30 aprile 2010	76,700 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
Costo ad aprile 2011	69,990 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	69,990 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	76,700 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	76,700
Regione Puglia	49,985 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
Acquedotto Pugliese Spa	26,715 Fonte: Delibera CIPE 72/2007
<hr/>	
Fondi residui:	-6,710

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
 Conferenza di servizi: Conclusa
 Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
 Modalità di selezione:
 Procedura:
 Sistema di realizzazione:
 Criterio di aggiudicazione:
 Fase progettuale a base di gara:
 Tempi di esecuzione:
 Progettazione:
 Lavori:
 Data bando:
 CIG/CUI:
 Data aggiudicazione:
 Tipo aggiudicatario:
 Nome aggiudicatario:
 Codice fiscale aggiudicatario:
 Data contratto:
Quadro economico:
 Importo a base gara:
 Importo oneri per la sicurezza:
 Importo complessivo a base di gara:
 Importo aggiudicazione:
 Somme a disposizione:
 Totale: 0,00
 % Ribasso di aggiudicazione:
 % Rialzo di aggiudicazione:
 Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
 Data presunta inizio lavori:
 Data presunta fine lavori:
 Stato avanzamento importo:
 Stato avanzamento percentuale:
 Data effettiva inizio lavori:
 Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto n. 294/2002 del Commissario per l'emergenza socio-economico-ambientale Regione Puglia del 30 Settembre 2002

Convenzione Regione Puglia-Acquedotto Pugliese Spa2002

del 30 Settembre 2002

Accordo di programma Quadro-Risorse idriche del 11 Marzo 2003

IGQ tra Governo e Regione Puglia del 10 Ottobre 2003

Decreti nn. 36-37-38/CD/I Commissario delegato per l'emergenza idrica in Puglia

del 1 Marzo 2004

I° Atto integrativo all'APQ del Ottobre 2006

Delibera CIPE 72/2007

del 3 Agosto 2007

Bandi di gara Acquedotto Pugliese Spa del 4 Luglio 2008

Avviso di aggiudicazione Acquedotto Pugliese Spa del Aprile 2009

Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Puglia del 6 Novembre 2009

Delibera CIPE 91/2010 del 18 Novembre 2010

Bandi di gara Acquedotto Pugliese Spa (III lotto) del 30 Maggio 2011

1° lotto - adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Trattandosi di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, l'ATI aggiudicatario ha redatto il progetto esecutivo

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 19.269.664,06
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 19.269.664,06
Importo di aggiudicazione: 13.673.023,26
Nome aggiudicatario: ATI: Simeone Nicola & Figlio s.r.l. - Salvatore Matarrese s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario: 01998440711
Data inizio: 22/05/2009
Data fine: 17/08/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 90 giorni
Lavori: 300 giorni
Data bando: 02/07/2008
CIG/CUI: 01813495EC
Data aggiudicazione: 02/12/2008
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI: Simeone Nicola & Figlio s.r.l. - Salvatore Matarrese s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario: 01998440711
Data contratto: 26/06/2009

Quadro economico:

Importo a base gara: 19.335.122,02
Importo oneri per la sicurezza: 194.542,04
Importo complessivo a base di gara: 19.529.664,06
Importo aggiudicazione: 13.856.739,26
Somme a disposizione: 4.219.808,27
Totale: 18.076.547,53
% Ribasso di aggiudicazione: 29,34
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	15/01/2010
Data presunta fine lavori:	20/03/2011
Stato avanzamento importo:	12.310.373,89
Stato avanzamento percentuale:	86,00
Data effettiva inizio lavori:	15/01/2010
Data effettiva fine lavori:	16/09/2011
Data presunta fine lavori varianti:	18/06/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - E' in fase di redazione la perizia di variante n. 2 che comporterà una proroga di ulteriori 90 gg
Data collaudo statico:	15/03/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/03/2012
Note:	15/01/10 consegna parziale dei lavori x indisponibilità aree x necessità saggi arch. preventivi. 24/05/10: consegna definitiva da cui decorrono i tempi contrattuali di 300 gg fino al 20/03/2011.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	90
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	Art. 132 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006
Importo:	14.277.197,71
Importo oneri sicurezza:	194.542,04
Somme a disposizione:	3.604.807,78
Totale:	18.076.547,53
Note:	E' in fase di approvazione la perizia di variante n. 2 per la realizzazione di nuovo by-pass fuori terra all'acquedotto del Pertusillo a seguito di manovra di apparecchiature idrauliche esistenti e della loro non funzionalità

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	

2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Trattandosi di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, il progetto esecutivo è stato redatto dall'ATI aggiudicataria

Progettazione esecutiva

CIPE: Sì
Importo lavori: 16.391.464,88
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 16.391.464,88
Importo di aggiudicazione: 12.287.452,21
Nome aggiudicatario: ATI: INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. - ANTONIO E RAFFAELE GIUZIO S.R.L.
Codice fiscale aggiudicatario: 00222300287
Data inizio: 26/06/2009
Data fine: 25/09/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 90 giorni
Lavori: 300 giorni
Data bando: 02/07/2008
CIG/CUI: 0181352865
Data aggiudicazione: 12/01/2009
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. - ANTONIO E RAFFAELE GIUZIO S.R.L.
Codice fiscale aggiudicatario: 00222300287
Data contratto: 11/05/2009

Quadro economico:

Importo a base gara: 16.161.107,74
Importo oneri per la sicurezza: 460.357,14
Importo complessivo a base di gara: 16.621.464,88
Importo aggiudicazione: 11.997.844,77
Somme a disposizione: 1.948.136,30

Totale: 13.945.981,07
% Ribasso di aggiudicazione: 25,76
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 17/02/2010
Data presunta fine lavori: 13/07/2011
Stato avanzamento importo: 7.658.632,97
Stato avanzamento percentuale: 63,00
Data effettiva inizio lavori: 17/02/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 10/11/2011
Tempi realizzazione: In ritardo - E' in fase di redazione la perizia di variante per i collegamenti idraulici che potrà comportare uno slittamento dei termini contrattuali di circa 120 giorni.
Data collaudo statico: 08/05/2012
Data collaudo tecnico-amministrativo: 08/05/2012
Note: I lavori sono stati consegnati parzialmente il 17/02/2010. La consegna definitiva dei lavori da cui decorrono i tempi contrattuali di 300 gg è avvenuta il 16/09/2010

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	2011
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	<p>La prima versione del progetto definitivo è stata approvata con delibera CIPE del 03/08/2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31.01.2008). Nel corso dello svolgimento delle attività propedeutiche alla fase di appalto (art. 71 co.1 del DPR n. 554/99), il Direttore dei Lavori ha constatato la presenza di numerose interferenze (manufatti di nuova costruzione e taluni ancora in fase di realizzazione) interessanti le aree oggetto dell'intervento.</p> <p>Conseguentemente questa Società ha provveduto ad aggiornare il progetto, modificando parzialmente il tracciato originario nel territorio dei comuni di Galatone e di Nardò, il quale è stato trasmesso al Ministero delle II e TT con nota n. 113643 del 07/09/2009. In data 22.04.2010 è stata convocata dalla Struttura Tecnica di Missione, presso il Ministero delle II e TT, la conferenza di servizi relativa al progetto in variante.</p> <p>Con la Deliberazione CIPE n.91/2010 (pubblicata sulla Gazzette Ufficiale n.71 del 28.03.2011) è stata approvato il progetto di variante in argomento anche ai fini della pubblica utilità.</p>

Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	34.011.970,47
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	0,00
Data inizio:	01/03/2004
Data fine:	06/09/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Acquedotto Pugliese Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	719 giorni
Data bando:	03/06/2011
CIG/CUI:	2582830ABB

Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:	33.472.980,00
Importo oneri per la sicurezza:	788.990,47
Importo complessivo a base di gara:	34.261.970,47
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	3.238.029,53
Totale:	37.500.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	02/07/2012
Data presunta fine lavori:	20/06/2014
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	17/12/2014
Data collaudo tecnico-amministrativo:	17/12/2014
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

2012

Previsione al 30/04/2010

2013

Previsione al 30/04/2011

2014
