


SCHEMI IDRICI
CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta
2° lotto

SCHEMA N. 166



LOCALIZZAZIONE

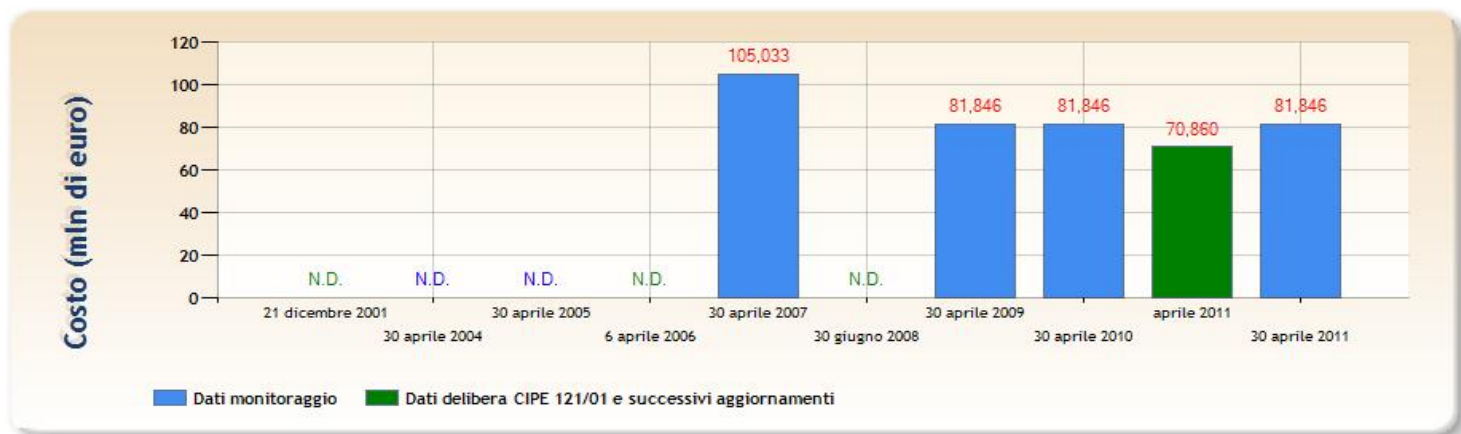

CUP:

J94E04000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Sorical Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

154/2005
7/2007

ULTIMAZIONE LAVORI

2012

DESCRIZIONE

L'intervento, riferito al II lotto di completamento dello schema idrico della diga sul torrente Menta, prevede la realizzazione di:

- una condotta forzata in acciaio di 8.932 m, in gran parte posata in trincea ed il resto in galleria;
- una centrale idroelettrica che ospiterà una turbina Pelton a due getti, con portata max di 2,5 metri cubi al secondo e potenza di 22,6 MW, con relativi quadri e servizi;
- delle opere di adduzione formate da un serbatoio di demodulazione, un impianto di potabilizzazione, una condotta di adduzione primaria e due adduttrici principali (adduttrice Nord ed adduttrice Sud) per 35 Km dalle quali si diramano le condotte di distribuzione per 30 Km.

DATI STORICI

1999

L'Accordo di Programma Quadro, siglato il 27 ottobre tra Stato e Regione Calabria, inserisce il progetto dello schema idrico del Menta tra le opere strategiche necessarie a completare lo schema idrico della Calabria e, in particolare, della fascia reggina.

2000

La Giunta regionale, con delibera del 12 gennaio, indice apposita selezione comparativa per la scelta di un socio di minoranza di una società a prevalente capitale pubblico cui affidare il completamento del complesso acquedottistico regionale e la sua gestione per il servizio di erogazione ai comuni calabresi al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, un riequilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi.

2001

L'intervento è incluso nella delibera n. 121 tra gli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Calabria.

2002

L'opera è compresa nell'IGQ tra Governo e Regione Calabria sottoscritta il 16 maggio.

La nota della Regione Calabria dell'11 novembre, individua quale soggetto aggiudicatore il Dipartimento 6° LL.PP. ed Acque – Settore Servizi Idrici Integrati della stessa Regione.

2003

A seguito della selezione comparativa per la scelta di un socio di minoranza di una società a prevalente capitale pubblico viene scelta l'ATI Enel Hydro Spa, con Acquedotto Pugliese Spa quale socio di minoranza ed si costituisce, in data 26 febbraio, la Società Risorse Idriche Calabresi Spa (SO.RI.CAL Spa). Successivamente il 46,5% della So.Ri.Cal. Spa è trasferito da Enel Hydro alla società francese Veolia - General des Eaux.

Il 13 giugno la Regione Calabria affida la realizzazione e la gestione delle opere idriche di interesse regionale alla Sorical S.p.A., società mista pubblico-privata costituita il 26 febbraio e partecipata per il 51% dalla Regione Calabria, per il 2,5% dalle Province calabresi e dall'ANCI e per il 46,5%, da Acque di Calabria Spa.

2004

Con la delibera n. 19, il CIPE ripartisce le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 riservando 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS e 288 Meuro alla "sicurezza", di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione del PIS.

Con la delibera n. 21, il CIPE finalizza i 1.130 Meuro della delibera n. 19 – al netto di 23 Meuro destinati alla premialità – ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal MIT, destinandoli al finanziamento - secondo la graduatoria – di alcuni interventi, tra cui figura anche, al 12° posto, l'opera "Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta: condotte di distribuzione e di potabilizzazione 3° lotto".

Il CIPE, con delibera n. 49, approva il progetto esecutivo del "Completamento dello schema idrico della diga sul Menta - 1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico", per 23,2 Meuro, assegnando alla Regione Calabria 23,2 Meuro e stabilendo, altresì, che il Piano economico finanziario riguardante i lotti successivi dovrà tener

conto dei rientri dell'intero schema idrico del Menta, compreso l'impianto idroelettrico.

2005

Il Ministero per i beni culturali, con nota del 24 gennaio, esprime parere favorevole.

La Commissione VIA, in data 10 maggio, esprime parere positivo con prescrizioni.

La delibera CIPE n. 98 finalizza le disponibilità residue ex delibera n. 21/2004 al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla undicesima della delibera n. 21/2004 e stabilisce che la sottoposizione al CIPE dei progetti avvenga entro ottobre 2005, pena la perdita delle disponibilità finanziarie.

Il Coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Corpo Forestale dello Stato, con nota del 24 settembre, esprime parere favorevole.

Il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, con nota del 18 ottobre, comunica che nella seduta del 28 settembre il COTER ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione, senza prescrizioni.

Il MIT, con nota del 26 ottobre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto preliminare corredata del Piano economico finanziario relativo all'intero schema idrico del Menta, proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del FAS, per le opere di adduzione con un importo di 79,7 Meuro, IVA inclusa.

Il CIPE, con delibera n. 154, approva con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal MIT, il progetto preliminare, articolato in "Opere a valle della centrale idroelettrica" e "Condotta forzata e centrale idroelettrica", per un importo complessivo di 100,2 Meuro (comprensivo di IVA), di cui 20,5 (comprensivo di IVA) per le opere della condotta forzata e della centrale idroelettrica a carico del soggetto aggiudicatore, e 79,6 Meuro (comprensivo di IVA) per le opere di adduzione a valle della centrale a carico della finanza pubblica. Nella stessa seduta il CIPE assegna alla Regione Calabria un contributo max di 79,65 Meuro, comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del FAS.

2006

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

In data 10 maggio si svolge la CdS.

Il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole con prescrizioni, sui due progetti in cui si articola l'intervento.

La Commissione VIA esprime parere positivo con prescrizioni sul progetto definitivo.

2007

Il MIT, il 15 gennaio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto definitivo corredata da documentazione di carattere economico-finanziario relativa all'intero schema idrico del Menta, come richiesto dalla delibera n. 154/2005 di approvazione del progetto preliminare, proponendo l'approvazione del progetto definitivo con prescrizioni, e l'assegnazione definitiva del finanziamento di euro 79,6 Meuro, già assentito con delibera n. 154/2005 a carico del FAS.

La Regione Calabria, con nota dell'8 febbraio, dichiara che la realizzazione delle opere assicura piena funzionalità all'intero schema idrico, raggiungendo l'obiettivo prefissato di integrazione idro-potabile per la città di Reggio Calabria e la fascia costiera reggina da Bocale a Campo Calabro, senza necessità di realizzare ulteriori opere.

Il MIT, il 16 febbraio, trasmette al CIPE la documentazione integrativa, tra cui il piano economico-finanziario redatto in forma analitica.

La Regione Calabria, con nota del 21 febbraio, si impegna ad assicurare l'entrata in esercizio dell'intero sistema idrico del Menta entro 49 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del progetto definitivo, di cui 7 necessari per le procedure di gara, prevedendo anche la realizzazione – entro 32 mesi – di un primo lotto funzionale più urgente che permetterà di alimentare i serbatoi di Modena e Reggio Campi.

Il CIPE, con delibera n. 7, approva con le prescrizioni e raccomandazioni del MIT, il progetto definitivo articolato in "Condotta forzata e centrale idroelettrica" e "Opere a valle della centrale idroelettrica" per un importo complessivo di 105 Meuro (comprensivo di IVA), e assegna alla Regione Calabria un contributo massimo di 79,65 Meuro (comprensivo di IVA), a valere sul FAS.

2008

Il CIPE rimanda la determinazione del contributo definitivo in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera, divisa in due interventi "Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)" e "Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" articolata in 4 lotti: 1A Menta condotta forzata e c.le idroelettrica; 1B Menta c.le idroelettrica op. elettromeccaniche; 2A Menta opere a valle della c.le elettrica; 2B Menta Impianto di potabilizzazione. Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera, divisa in due interventi "Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)" e "Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori: primo intervento 66%, secondo 70%). Inoltre, è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" articolata in 4 lotti: 1A Menta condotta forzata e c.le idroelettrica; 1B Menta c.le idroelettrica op. elettromeccaniche; 2A Menta opere a valle della c.le elettrica; 2B Menta Impianto di potabilizzazione.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, i quattro lotti che compongono l'opera presentano un avanzamento lavori compreso tra il 90% e il 95% e la loro ultimazione è prevista entro settembre 2012.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	105,033 Fonte: Delibera CIPE 7/2007
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	81,846 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	81,846 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Costo ad aprile 2011	70,860 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	81,846 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	70,470 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	105,033
So.Ri.Cal. Spa	25,378 Fonte: Delibera CIPE 10/2009; Delibera CIPE 7/2007.
Fondi Pubblici	79,655 Fonte: Delibera CIPE 10/2009; Delibera CIPE 7/2007

Fondi residui: **-23,187**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Accordo Programma Quadro Regione Calabria del 27 Ottobre 1999

Delibera di Giunta Regionale n. 5

del 12 Gennaio 2000

IGQ tra Governo e Regione Calabria del 16 Maggio 2002

Legge n. 289/2002 (artt. 60 e 61)

del 27 Dicembre 2002

Convenzione Regione Calabria-SO.RI.CAL del 13 Giugno 2003

Legge n. 350/2003 (art. 4, comma 128)

del 24 Dicembre 2003

Delibera CIPE 19/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 49/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 98/2005

del 29 Luglio 2005

Delibera CIPE 154/2005

del 2 Dicembre 2005

Delibera CIPE 7/2007

del 16 Marzo 2007

Bandi di gara So.Ri.Cal. Spa del Luglio 2007

Avviso di aggiudicazione So.Ri.Cal. Spa del Novembre 2007

Avviso di aggiudicazione So.Ri.Cal. Spa del Dicembre 2007

Centrale Idroelettrica S. San Salvatore e Condotta Forzata - Opere Civili

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 13.068.344,37

Servizio: Interno

Costo progettazione interno: 0,00

Data inizio: 13/03/2007

Data fine: 06/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Sorical Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	0 giorni
Lavori:	608 giorni
Data bando:	21/06/2007
CIG/CUI:	00501698C2
Data aggiudicazione:	23/10/2007
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI SRL - IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	01533430797
Data contratto:	08/01/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	12.514.529,45
Importo oneri per la sicurezza:	553.814,92
Importo complessivo a base di gara:	13.068.344,37
Importo aggiudicazione:	8.148.919,55
Somme a disposizione:	9.583.991,21
Totale:	17.732.910,76
% Ribasso di aggiudicazione:	39,31
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	12/12/2007
Data presunta fine lavori:	11/08/2009
Stato avanzamento importo:	7.727.800,00
Stato avanzamento percentuale:	94,00
Data effettiva inizio lavori:	12/12/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/09/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo - PRIMA PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE GG. 90 DAL 31/12/2009 AL 10/03/2010
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO INN CORSO D'OPERA - DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO STATICO 01/10/2012 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO 30/12/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 629
Note: PRIMA SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DAL 22/10/2008 AL 23/02/2009 GG 124 - SECONDA SOSPENSIONE TOTALE LAVORI DAL 28/01/2010 AL 17/06/2011 GG 505 - ADEGUAMENTO PROGETTO EDIFICIO CENTRALE IDROELETTRICA

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 202
Motivi:
Altri motivi: N. 1 PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI GG. 90 DA 31/12/2009 AL 10/03/2010
Importo: 10.941.832,09
Importo oneri sicurezza: 553.814,92
Somme a disposizione: 6.062.365,30
Totale: 17.558.012,31
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009 2011
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2012

Centrale Idroelettrica S. San Salvatore - Opere elettromeccaniche

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 4.783.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 62.080,00
Importo di aggiudicazione: 80.000,00
Nome aggiudicatario: CO-VER ENERGIA SRL
Codice fiscale aggiudicatario: 01560970038
Data inizio: 13/03/2007
Data fine: 06/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Sorical Spa
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	750 giorni
Data bando:	27/11/2007
CIG/CUI:	0050303757
Data aggiudicazione:	03/01/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CO-VER ENERGIA SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	01560970038
Data contratto:	12/07/2008

Quadro economico:

Importo a base gara:	4.845.080,00
Importo oneri per la sicurezza:	92.283,00
Importo complessivo a base di gara:	4.937.363,00
Importo aggiudicazione:	4.932.283,00
Somme a disposizione:	1.902.804,31
Totale:	6.835.087,31
% Ribasso di aggiudicazione:	0,10
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: L'importo complessivo del Quadro Economico a seguito di gara è pari ad € 6.835.087,31 e non € 6.778.087,31 così come viene calcolato in automatico nella precedente finestra.
MODALITA' DI SELEZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO -
I TEMPI DI ESECUZIONE PROGETTAZIONE SONO RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	30/07/2008
Data presunta fine lavori:	30/07/2010
Stato avanzamento importo:	2.479.200,00
Stato avanzamento percentuale:	50,26
Data effettiva inizio lavori:	30/07/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/09/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGA SOSPENSIONE LAVORI

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO: 01/10/2012 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO: 31/12/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

1

Totale giorni sospensione:

334

Note:

SOSPENSIONE LAVORI DAL 29/01/2010 AL 05/07/2010 E PROROGATA DAL 09/07/2010 AL 02/01/2011 POICHE' I LAVORI A MONTE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA HANNO SUBITO RALLENTAMENTI PER CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale:

0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

2011

Previsione al 30/04/2010

2011

Previsione al 30/04/2011

2012

Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Condotte di distribuzione

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note: IL PROGETTO E' STATO REDATTO DALLA DIREZIONE TECNICA SO.RI.CAL.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 46.399.034,25

Servizio: Interno

Costo progettazione interno: 0,00

Data inizio: 13/03/2007
Data fine: 06/06/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Sorical Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 0 giorni
Lavori: 768 giorni
Data bando: 21/06/2007
CIG/CUI: 0050326A51
Data aggiudicazione: 23/10/2007
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI VINCENZO RESTUCCIA - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE
Codice fiscale aggiudicatario: 01533430797
Data contratto: 08/01/2008

Quadro economico:

Importo a base gara: 45.862.449,91
Importo oneri per la sicurezza: 536.584,35
Importo complessivo a base di gara: 46.399.034,26
Importo aggiudicazione: 26.851.291,39
Somme a disposizione: 23.104.863,53
Totale: 49.956.154,92
% Ribasso di aggiudicazione: 42,62
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 12/12/2007
Data presunta fine lavori: 28/02/2012
Stato avanzamento importo: 26.675.200,00
Stato avanzamento percentuale: 90,00
Data effettiva inizio lavori: 12/12/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 01/03/2012
Tempi realizzazione: In ritardo - SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DAL 14/10/2010 AL 31/05/2011 GG. 229
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera - Collaudo Statico data prevista inizio: 01/03/2012 data prevista fine: 30/06/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	300
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	29.097.865,87
Importo oneri sicurezza:	536.584,34
Somme a disposizione:	20.321.704,71
Totale:	49.956.154,92
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	2011
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2012

Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Impianto di potabilizzazione

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 10.726.695,68

Servizio: Esterno

Importo a base gara: 191.582,11

Importo di aggiudicazione: 100.019,59

Nome aggiudicatario: ACCIONA AGUA S. A. - COSTRUZIONI GENERALI SICLARI AGOSTINO

Codice fiscale aggiudicatario: 04694710965

Data inizio: 12/12/2007

Data fine: 29/12/2008

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Sorical Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	190 giorni
Data bando:	21/06/2007
CIG/CUI:	0050297265
Data aggiudicazione:	13/10/2007
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ACCIONA AGUA S. A. - COSTRUZIONI GENERALI SICLARI AGOSTINO
Codice fiscale aggiudicatario:	04694710965
Data contratto:	08/01/2008

Quadro economico:

Importo a base gara:	10.764.132,20
Importo oneri per la sicurezza:	154.145,59
Importo complessivo a base di gara:	10.918.277,79
Importo aggiudicazione:	8.149.737,25
Somme a disposizione:	5.071.563,15
Totale:	13.221.300,40
% Ribasso di aggiudicazione:	25,72
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: L'importo complessivo del Quadro Economico a seguito di gara è pari ad € 15.428.039,17 e non ad € 15.798.258,83 così come risulta dal calcolo effettuato in automatico nel riquadro precedente.
I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE SI RIFERISCONO AL PROGETTO ESECUTIVO.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	12/12/2007
Data presunta fine lavori:	29/11/2008
Stato avanzamento importo:	8.057.475,94
Stato avanzamento percentuale:	94,39
Data effettiva inizio lavori:	12/12/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/11/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - N. 3 PROROGHE TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI - 1: DAL 28/11/2008 - GG. 57 2: 30/01/2009 GG.40 3: 09/03/2009 GG. 30

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: DATA PREVISTA INIZIO COLLAUDO 01/12/2011 - DATA PREVISTA FINE COLLAUDO 31/03/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

1

Totale giorni sospensione:

763

Note:

SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI DAL 07/04/2009 AL 10/05/2011

Varianti:

Numero totale:

1

Giorni proroga totali:

10

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

8.374.949,66

Importo oneri sicurezza:

161.732,75

Somme a disposizione:

4.684.617,99

Totale:

13.221.300,40

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

2011

Previsione al 30/04/2010

2011

Previsione al 30/04/2011

2011
