


PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA

SCHEDA N. 184



LOCALIZZAZIONE

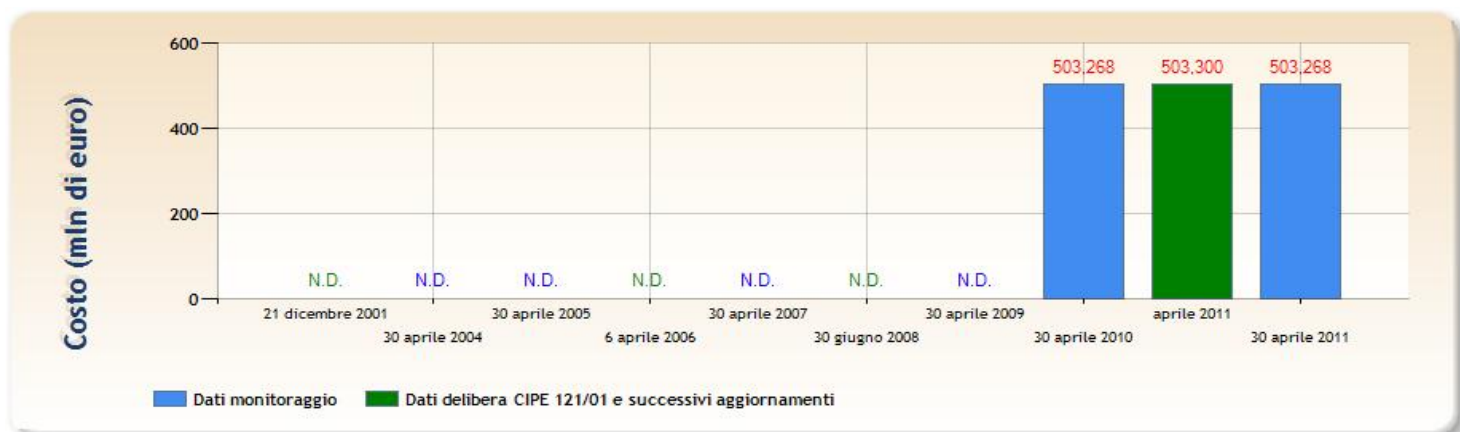

CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Edilizia penitenziaria

Ministero della Giustizia

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

58/2009

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Il "Programma Carceri" è finalizzato alla costruzione dei seguenti nuovi istituti penitenziari:

- Cagliari
- Sassari
- Tempio Pausania
- Oristano
- Forlì
- Rovigo
- Savona
- Reggio Calabria

Il "Programma straordinario per il finanziamento di istituti penitenziari in corso di costruzione", elaborato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con il MIT, è volto ad aumentare la capacità totale a 2.095 "posti detenuto".

DATI STORICI

2003

Con decreto del Ministro della giustizia del 2 ottobre viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria, fatta salva la possibilità di parziali deroghe in relazione a concrete prospettive di permuta e/o locazione finanziaria: Rieti, Marsala, Savona, Rovigo, Sassari, Cagliari Tempio Pausania, Forlì, Oristano, Varese, Pordenone, Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Mistretta, Catania, Trento e Bolzano. Il decreto stabilisce che tutti gli interventi rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza e, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1097/1994, sono state dichiarate secretate le gare per l'affidamento dei lavori.

2005

Il 22 dicembre vengono affidate le gare con la procedura dell'appalto integrato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lett. b), della legge n. 109/1994, mediante gara informale tra ditte di fiducia dell'amministrazione in possesso di abilitazione di sicurezza NOS.

2008

Il CIPE, con delibera n. 112, dispone l'assegnazione di 7.356 Meuro a favore del Fondo Infrastrutture, per interventi di competenza del MIT.

2009

L'articolo 44-bis del decreto legge n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria predisponga un programma degli interventi per fronteggiare la sovrappopolazione delle carceri e che, con successivi DPCM, siano determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma che verranno inserite nella Legge Obiettivo.

Il CIPE, con delibera n. 3, dispone l'assegnazione di 5 miliardi di euro per il Fondo Infrastrutture, destinando 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza delle scuole e 200 Meuro per l'edilizia carceraria.

Il MIT, con nota del 24 luglio, successivamente integrata e parzialmente rettificata con note del 28 e del 30 luglio, trasmette al CIPE il Programma straordinario, precisando che: i lavori per l'istituto di Savona sono già appaltati e saranno consegnati inizio 2010; il contratto a suo tempo stipulato per l'affidamento dei lavori relativi all'istituto di Reggio Calabria è stato rescisso e si sta procedendo a una nuova aggiudicazione. Per gli istituti di Savona e Reggio Calabria, i finanziamenti richiesti a valere sul Fondo Infrastrutture consentiranno di rendere funzionali i soli lotti in corso di realizzazione, rimanendo da finanziare, per il completamento delle opere, un fabbisogno pari rispettivamente a circa 30,5 e 10,5 Meuro, per circa complessivi 41 Meuro.

Il CIPE, con delibera n. 58, prende atto che il costo complessivo degli interventi ammonta a 503,3 Meuro e che le risorse disponibili, impegnate a valere sul capitolo 7473 del bilancio del MIT, sono pari a 262,2 Meuro. Il CIPE assegna agli interventi di edilizia penitenziaria individuati nel Programma straordinario, gli importi singolarmente specificati nel Programma, per complessivi 200 Meuro. L'assegnazione è a valere sulla dotazione di 200 Meuro

destinata al finanziamento di interventi di edilizia carceraria, già disposta con delibera n. 3/2009 nell'ambito della complessiva attribuzione di 5 miliardi di euro a favore del Fondo Infrastrutture.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 la voce "Edilizia carceraria" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 la voce "Edilizia carceraria" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	N.D. Fonte:
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	N.D. Fonte:
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2010	503,268 Fonte: Delibera CIPE 58/2009
Costo ad aprile 2011	503,300 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	503,268 Fonte: Delibera CIPE 58/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte:
Risorse disponibili ad aprile 2011	503,300 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	503,268
Fondi Pubblici	303,268 Fonte: DEF 2012-2014
Fondo Infrastrutture	200,000 Fonte: Delibera CIPE 58/2009

Fabbisogno residuo: **0,000**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto-legge n. 112 (art. 6-quinquies)

del 25 Giugno 2008

Decreto-legge n. 185 (art. 18)

del 29 Novembre 2008

Delibera CIPE 112/2008

del 18 Dicembre 2008

Decreto-legge n. 207 (art. 44-bis)

del 30 Dicembre 2008

Legge n. 14/2009
del 27 Febbraio 2009
Delibera CIPE 3/2009
del 6 Marzo 2009
Delibera CIPE 51/2009
del 26 Giugno 2009
Delibera CIPE 58/2009
del 31 Luglio 2009

Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione definitiva
CIPE: Si
Importo lavori: 68.329.331,94
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 510.000,00
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 1100 giorni
Data bando:
CIG/CUI: 116219734D
Data aggiudicazione: 22/12/2005
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: OPERE PUBBLICHE S.p.A / Soc. CIOTOLA S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 00600890925
Data contratto: 18/04/2006
Quadro economico:
Importo a base gara: 68.329.331,94
Importo oneri per la sicurezza: 1.931.775,02
Importo complessivo a base di gara: 70.261.106,96

Importo aggiudicazione: 61.856.599,13
Somme a disposizione: 10.669.229,42
Totale: 72.525.828,55
% Ribasso di aggiudicazione: 12,30
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: l'importo deliberato dal CIPE comprende il progetto di 1° e 2° fase nonché la realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 09/11/2006
Data presunta fine lavori: 25/09/2011
Stato avanzamento importo: 65.867.492,05
Stato avanzamento percentuale: 94,66
Data effettiva inizio lavori: 09/11/2006
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 25/09/2011
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione definitiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	64.885.575,50
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	559.771,96
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	1100 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	1161911748
Data aggiudicazione:	22/12/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ANEMONE COSTRUZIONI S.r.l./ I.G.I.T. S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	08060641001
Data contratto:	17/05/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	64.885.575,50
Importo oneri per la sicurezza:	1.115.676,23
Importo complessivo a base di gara:	66.603.837,38
Importo aggiudicazione:	60.731.692,80
Somme a disposizione:	8.884.040,20
Totale:	69.615.733,00

% Ribasso di aggiudicazione: 9,05

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: l'importo deliberato dal CIPE comprende il progetto di 1° e 2° fase nonché la realizzazione del nuovo padiglione per detenuti sottoposti all'art. 41/bis

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 15/03/2007
Data presunta fine lavori: 25/06/2011
Stato avanzamento importo: 53.151.016,23
Stato avanzamento percentuale: 88,40
Data effettiva inizio lavori: 15/03/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 13/09/2011
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 80
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 59.616.016,57
Importo oneri sicurezza: 1.115.676,23
Somme a disposizione: 8.884.040,20
Totale: 69.615.733,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009

Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione definitiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	53.817.723,89
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	474.164,73
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	900 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	1161128123
Data aggiudicazione:	22/12/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	GIA.FI. S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	03515570483
Data contratto:	23/03/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	53.817.723,89
Importo oneri per la sicurezza:	1.070.950,94
Importo complessivo a base di gara:	54.888.674,83
Importo aggiudicazione:	50.118.318,65
Somme a disposizione:	7.084.681,35
Totale:	57.203.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:	9,57
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	21/12/2009
Stato avanzamento importo:	48.731.624,24
Stato avanzamento percentuale:	98,00
Data effettiva inizio lavori:	06/03/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	25/06/2011
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	49.467.617,71
Importo oneri sicurezza:	1.070.950,94
Somme a disposizione:	7.164.431,34
Totale:	57.702.999,99
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

Nuovo istituto penitenziario di Oristano

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione definitiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	42.833.601,24
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	321.000,00
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	900 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	1161706E1A
Data aggiudicazione:	22/12/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	UNILAND Scarl / CIMAS S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	06031390724
Data contratto:	17/05/2006
Quadro economico:	
Importo a base gara:	42.833.601,24
Importo oneri per la sicurezza:	819.110,96
Importo complessivo a base di gara:	43.652.712,20
Importo aggiudicazione:	38.855.348,86
Somme a disposizione:	6.157.880,54
Totale:	45.013.229,40
% Ribasso di aggiudicazione:	11,20
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	25/06/2011
Stato avanzamento importo:	43.276.331,42
Stato avanzamento percentuale:	96,00
Data effettiva inizio lavori:	12/04/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	Richieste Amministrazione usuaria
Importo:	39.976.119,47
Importo oneri sicurezza:	819.110,97
Somme a disposizione:	6.023.880,53
Totale:	46.819.110,97
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

Nuovo istituto penitenziario di Forlì

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	per il dettaglio sulle fasi successive si rimanda alle schede relative ai vari lotti
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	43.909.848,33
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.462.705,00
Importo di aggiudicazione:	1.298.601,67
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	30/11/2006
Data fine:	09/05/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
Quadro economico:	
Importo a base gara:	
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2012
Previsione al 30/04/2011 2014

1 fase

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	4.206.952,29
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	85.002,70
Importo di aggiudicazione:	65.386,69
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	01/07/2006
Data fine:	16/11/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	550 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	27/12/2006
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ADANTI SpA - BUSI IMPIANTI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	01935981207
Data contratto:	17/01/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.076.389,64
Importo oneri per la sicurezza:	130.562,65
Importo complessivo a base di gara:	4.206.952,29
Importo aggiudicazione:	3.024.391,66
Somme a disposizione:	3.349.096,36
Totale:	6.373.488,02
% Ribasso di aggiudicazione:	29,01
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	3.322.544,25
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	12/03/2008
Data effettiva fine lavori:	04/06/2010
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	collaudo in attesa di rilascio

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	1
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	2
Totale giorni sospensione:	114
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	150
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	3.196.191,08
Importo oneri sicurezza:	141.054,65
Somme a disposizione:	4.218.802,92
Totale:	7.556.048,65
Note:	l'importo totale invariato è pari ad € 7.556.048,65

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2010

1° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	No
Importo lavori:	27.237.500,00
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.902.092,32
Importo di aggiudicazione:	1.463.147,94
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588-0042
Data inizio:	30/11/2006
Data fine:	02/07/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1350 giorni
Data bando:	19/10/2007
CIG/CUI:	0081617878
Data aggiudicazione:	18/12/2007
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	CIR Costruzioni SpA - IMET SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	01675900383
Data contratto:	16/10/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	26.450.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	787.500,00
Importo complessivo a base di gara:	27.237.500,00
Importo aggiudicazione:	18.121.118,57
Somme a disposizione:	4.459.685,00
Totale:	22.580.803,57
% Ribasso di aggiudicazione:	34,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	

Data presunta fine lavori: 18/12/2013
Stato avanzamento importo: 165.000,00
Stato avanzamento percentuale: 1,00
Data effettiva inizio lavori: 07/04/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire: 8
Note: non è stata avviata la procedura di accordo bonario in quanto parte delle riserve è manifestamente infondata

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2013

2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:**Note:****Progettazione esecutiva**

CIPE:	No
Importo lavori:	13.061.318,90
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	258.867,69
Importo di aggiudicazione:	199.128,99
Nome aggiudicatario:	ATI Planarch srl - SVEI SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	29/01/2010
Data fine:	30/03/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	25/03/2011
CIG/CUI:	12499871E7
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
Quadro economico:	
Importo a base gara:	
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2014

Nuovo istituto penitenziario di Rovigo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2012
Previsione al 30/04/2011 2014

1° lotto e 2° lotto 1° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: La gara prevedeva la compilazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di tutto l'intervento.
Per la limitazione del finanziamento previsto con il D.M. B3/2/743 del 19.04.2005, in un primo momento è stato realizzato il progetto preliminare complessivo, il progetto definitivo complessivo ed il progetto esecutivo del I° stralcio.
In gara non è stato inserito l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, cui si è provveduto mediante atto aggiuntivo dell'importo di €.132.759,16-. L'adeguamento della parcella all'effettivo importo progettuale ha comportato una maggiore spesa di €.62.420,14-. Pertanto l'importo totale della progettazione, con il progetto esecutivo del solo I° stralcio, è pari a €. 1.447.252,30-.
A seguito dello stanziamento di ulteriori fondi, con apposito atto aggiuntivo al contratto, è stato affidato allo stesso RTI, a fronte di una miglioria del 5% dell'offerta originaria, l'incarico di compilazione del progetto esecutivo di II° stralcio, che per motivi di esecuzione è stato suddiviso in due sub stralci, il I° sub stralcio relativo alle opere intramoenia ed il II° sub stralcio relativo alle opere extramoenia. L'importo della progettazione esecutiva del II° stralcio, I° substralcio opere intramoenia, è pari a €.157.628,21- e quindi l'importo totale della progettazione preliminare e definitiva dell'intero intervento ed esecutiva delle opere intramoenia ammonta ad €.1.604.880,51-.
La progettazione esecutiva del II° stralcio I° sub stralcio è iniziata il 15.07.2010 e si è conclusa il 16.09.2010 con un importo lordo di lavori indicato nel progetto pari a €.8.577.102,43-. L'importo totale delle opere intramoenia progettato è quindi pari a €.29.687.571,68-.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori:	21.110.469,25
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.433.031,00
Importo di aggiudicazione:	1.252.073,00
Nome aggiudicatario:	R.T.I PLANARCH Srl - SVEI Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	05565890588
Data inizio:	03/10/2005
Data fine:	07/09/2006

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Magistrato alle Acque - provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di venezia
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1095 giorni
Data bando:	20/11/2006
CIG/CUI:	0798030B2D
Data aggiudicazione:	20/12/2006
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	S.A.C.A.I.M. Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	03134600273
Data contratto:	18/04/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	20.696.538,48
Importo oneri per la sicurezza:	413.930,77
Importo complessivo a base di gara:	21.110.469,25
Importo aggiudicazione:	17.730.742,52
Somme a disposizione:	6.940.130,75
Totale:	24.670.873,27
% Ribasso di aggiudicazione:	0,16
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: Gara indetta mediante procedura speciale – gara informale, seduta unica - trattativa privata - ricorrendo gli estremi di cui all'art. 17 D.Lgs. n.163/2006. L'affidamento dei lavori del I° stralcio è avvenuto tenendo conto della insufficienza della somma stanziata con D.M. B3/2/743 del 19.04.2005. A seguito di successivo stanziamento di fondi, si è ritenuto necessario affidare, per univocità di responsabilità, i lavori intramoenia (II° stralcio - I° sub stralcio) agli stessi operatori (impresa e responsabile della sicurezza) che stavano eseguendo i lavori e servizi del I° stralcio, a fronte di una miglioria del 6,00% del ribasso originariamente offerto (16,33%), quindi per un ribasso complessivo del 22,33%. E' stato pertanto formalizzato l'atto aggiuntivo di netti €6.720.997,08- (compresi gli oneri di sicurezza), con un ulteriore tempo per eseguire i lavori di gg.450-, che è stato inserito nella sezione varianti.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	23/07/2007
Data presunta fine lavori:	22/07/2010
Stato avanzamento importo:	20.033.949,69

Stato avanzamento percentuale: 0,73
Data effettiva inizio lavori: 23/07/2007
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 07/05/2012
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: A seguito dell'atto aggiuntivo relativo ai lavori di II° stralcio I° sub stralcio opere intramoenia, è stato automaticamente esteso l'incarico di collaudo, sia statico che tecnico amministrativo.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 175
Note:

Per procedere sia alla bonifica da ordigni residuati bellici sia, successivamente, alle verifiche imposte dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Padova, i lavori sono stati sospesi del 31.10.2007 al 31.03.2008 per gg. 152.
In attesa della registrazione dell'atto aggiuntivo relativo al II° stralcio, I° sub stralcio opere intramoenia, i lavori, consegnati sotto riserva di legge, sono stati sospesi dal 04.04.2011 al 27.04.2011 per gg. 23.

Varianti:

Numero totale: 3
Giorni proroga totali: 480
Motivi:
Altri motivi:

Durante il corso dei lavori del I° stralcio sono state predisposte due perizie suppletive e di variante che hanno comportato la prima una riduzione del tempo contrattuale di gg. 30 e la seconda un aumento del tempo contrattuale di gg. 30. E' stata anche concessa una proroga di gg. 30. Con l'atto aggiuntivo dei lavori di II° stralcio I° sub stralcio opere intramoenia è stato concesso un ulteriore tempo per eseguire i lavori di gg.450.

Importo: 26.828.602,90
Importo oneri sicurezza: 678.873,09
Somme a disposizione: 8.893.124,01
Totale: 36.400.600,00

Note:

Durante il corso dei lavori del I° stralcio sono state predisposte due perizie suppletive e di variante, anche per le modifiche al progetto richieste dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, relativamente agli impianti ed alle specifiche di sicurezza penitenziaria (grate celle, porte celle, serrature celle, impiantistica celle, ecc).

Tali varianti hanno comportato un importo per lavori netto di € 20.372.548,14-, un importo per oneri sicurezza di € 413.930,77- e per somme a disposizione di € 7.264.121,09-.

A seguito di successivo stanziamento di fondi, si è ritenuto necessario affidare, per univocità di responsabilità, i lavori intramoenia (II° stralcio - I° sub stralcio) agli stessi operatori (impresa e responsabile della sicurezza) che stavano eseguendo i lavori e servizi del I° stralcio, a fronte di una miglioria del 6,00% del ribasso originariamente offerto (16,33%), quindi per un ribasso complessivo del 22,33%.

Tali lavori hanno comportato un aumento dell'importo per lavori netto di € 6.456.054,76- un importo per oneri sicurezza di € 264.942,32- e per somme a disposizione di € 1.629.002,92, elevando l'importo complessivo del quadro economico dei due progetti assemblati da € 28.050.600,00- a € 36.400.600,00-.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2012

2° lotto - 2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Conclusa

Note:

La gara del I° lotto prevedeva la compilazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di tutto l'intervento. Per la limitazione del finanziamento previsto con il D.M. B3/2/743 del 19.04.2005, in un primo momento è stato realizzato il progetto preliminare complessivo, il progetto definitivo complessivo ed il progetto esecutivo del I° stralcio. In gara non è stato inserito l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, cui si è provveduto mediante atto aggiuntivo dell'importo di € 132.759,16-. L'adeguamento della parcella all'effettivo importo progettuale ha comportato una maggiore spesa di € 62.420,14-. Pertanto l'importo totale della progettazione, con il progetto esecutivo del solo I° stralcio, è pari a € 1.447.252,30-. A seguito dello stanziamento di ulteriori fondi, con apposito atto aggiuntivo al contratto, è stato affidato allo stesso RTI, a fronte di una miglioria del 5% dell'offerta originaria, l'incarico di compilazione del progetto esecutivo di II° stralcio, che per motivi di esecuzione è stato suddiviso in due sub stralci, il I° sub stralcio relativo alle opere intramoenia ed il II° sub stralcio relativo alle opere extramoenia. L'importo della progettazione esecutiva del II° stralcio, I° substralcio opere intramoenia, è pari a € 157.628,21- e quindi l'importo totale della progettazione preliminare e definitiva dell'intero intervento ed esecutiva delle opere intramoenia ammonta ad € 1.604.880,51-. La scheda attuale si riferisce alla progettazione esecutiva del II° stralcio II° sub stralcio (opere extra moenia) già contrattualizzata con l'atto aggiuntivo già citato.

Progettazione esecutiva

CIPE:

Si

Importo lavori:

11.116.522,00

Servizio:

Esterno

Importo a base gara:

311.566,03

Importo di aggiudicazione: 200.549,40
Nome aggiudicatario: R.T.I PLANARCH Srl - SVEI Spa
Codice fiscale aggiudicatario: 05565890588
Data inizio: 15/07/2010
Data fine: 12/09/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Magistrato alle Acque - provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di venezia
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 450 giorni
Data bando: 08/06/2011
CIG/CUI: 26888079B8
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara: 10.819.238,54
Importo oneri per la sicurezza: 297.313,46
Importo complessivo a base di gara: 11.116.552,00
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione: 2.133.448,00
Totale: 13.250.000,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2014

Nuovo istituto penitenziario di Savona

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: L'importo dei lavori andati in gara è inferiore a quello dei lavori progettati per riduzione del finanziamento.

Progettazione definitiva

CIPE: No
Importo lavori: 32.000.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 935.124,34
Importo di aggiudicazione: 935.124,34
Nome aggiudicatario: ATP CRAVEDI, GHILLANI, ZATTERA
Codice fiscale aggiudicatario: CRVGRG41L19G337R
Data inizio: 13/09/2004
Data fine: 17/12/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	120 giorni
Lavori:	1095 giorni
Data bando:	08/11/2006
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	24/07/2008
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI IM.A.C.IMPRESA APPALTI COSTRUZIONI SRL - EDILCONTRACT SRL - GESTECOS SRL - SO.IN.C. SRL - STUDIO LATINI SRL - ESE ENGINEERING SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	04013060589
Data contratto:	23/12/2008
Quadro economico:	
Importo a base gara:	23.256.650,00
Importo oneri per la sicurezza:	1.295.010,18
Importo complessivo a base di gara:	24.551.660,18
Importo aggiudicazione:	22.200.412,86
Somme a disposizione:	5.414.900,02
Totale:	27.615.312,88
% Ribasso di aggiudicazione:	10,11
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'importo degli oneri di sicurezza è comprensivo degli oneri di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso pari ad € 525.228,36. Trattasi di appalto riservato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 163/2006.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010 2014

Previsione al 30/04/2011 2014

Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:

Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011

Lotto 1

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: La progettazione del 1° stralcio è stata effettuata dal Nucleo Operativo di Reggio Calabria sulla base del progetto generale redatto dal RTI CMC - PIZZAROTTI.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 4.336.186,99
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 43.361,87
Data inizio: 27/08/1995
Data fine: 19/10/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 70 giorni
Lavori: 720 giorni
Data bando: 07/02/1992

CIG/CUI:

Data aggiudicazione: 23/04/1992
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CMC - PIZZAROTTI SPA
Codice fiscale aggiudicatario: 00084280395
Data contratto: 06/03/1996

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.119.888,97
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara: 4.119.888,97
Importo aggiudicazione: 3.924.194,24
Somme a disposizione: 1.044.680,02
Totale: 4.968.874,26
% Ribasso di aggiudicazione: 4,75
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

Per la realizzazione dell'opera era stato prescelto il sistema della concessione di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Previa gara esplorativa veniva individuato il RTI CMC (capogruppo). PIZZAROTTI SPA con il ribasso del 4,75%. A seguito dei divieti imposti dalla subentrata Legge 109/94, tale sistema veniva scartato e sostituito con contratto a trattativa privata con il RTI che si era assicurata la concessione.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 18/04/1996
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 3.500.077,00
Stato avanzamento percentuale: 84,14
Data effettiva inizio lavori: 18/04/1996
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 02/10/2000
Tempi realizzazione: In ritardo - L'impresa ha abbandonato i lavori spontaneamente, senza mai riavviarli nonostante 14 ordini di servizio. Successivamente ha avviato arbitrato per rescissione del contratto.

Data collaudo statico:**Data collaudo tecnico-amministrativo:****Note:**

I collaudi Statico e tecnico-amministrativo sono in corso

Contenzioso:**Totale riserve definite:****Importo totale riserve definite:****Totale riserve da definire:****Note:**

Tutte le riserve apposte dal RTI sul registro di contabilità (nr. 12) sono state oggetto di arbitrato.

Sospensione lavori:**Numero totale:**

3

Totale giorni sospensione:

579

Note:

La sospensione nr. 1 di giorni 486 si è resa necessaria perchè la Corte dei conti di Catanzaro ha ricusato il visto sul contratto a trattativa privata del 6/3/1996 nr. 1502.

La sospensione nr. 2 di giorni 51 per inaccessibilità dei mezzi pesanti della strada di accesso al cantiere.

la sospensione nr. 3 di giorni 42 per causa di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche).

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

Lotto 2

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Si è trattato non di gara, ma di un affidamento della progettazione sulla base del contratto a trattativa privata del 06/03/1996, le date di inizio e fine si riferiscono al D.P di incarico e al voto del CTA che ha espresso parere favorevole-L'importo dei lavori è comprensivo dell'aggiornamento dei prezzi del 6% e del ribasso di contratto del 4,75%

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 15.424.646,45
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 22.724.103,56
Importo di aggiudicazione: 22.724.103,56
Nome aggiudicatario: ATI-CMC Cooperativa Muratori e Cementisti -Ravenna-Pizzarotti & C SpA-Noceto(PR)
Codice fiscale aggiudicatario: 000084280395-017
Data inizio: 29/10/1999
Data fine: 21/12/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento diretto
Procedura:
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 720 giorni
Data bando: 06/03/1996
CIG/CUI: -----
Data aggiudicazione: 30/12/1999
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ATI-CMC Cooperativa Muratori e Cementisti -Ravenna-Pizzarotti &C-
Noceto(PR)
Codice fiscale aggiudicatario: 000084280395-017
Data contratto: 30/12/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 15.424.646,45
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 15.424.646,45
Importo aggiudicazione: 15.425.646,45
Somme a disposizione: 7.299.457,11
Totale: 22.725.103,56

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: I lavori sono stati affidati con atto aggiuntivo n.1 del 30/12/1999 n.1759 di rep.al contratto a trattativa privata del 06/03/1996 n.1502 di rep.L'importo dei lavori è comprensivo dell'aggiornamento dei prezzi del 6% e del ribasso del 4,75% come da contratto.L'importo complessivo è composto per lavori principali e lavori aggiuntivi

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 19/12/2000
Data presunta fine lavori: 08/12/2002
Stato avanzamento importo: 13.197.172,00
Stato avanzamento percentuale: 96,86
Data effettiva inizio lavori: 19/12/2000
Data effettiva fine lavori: 17/04/2003
Data presunta fine lavori varianti: 17/04/2003
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 02/07/2004
Data collaudo tecnico-amministrativo: 02/03/2007

Note: I certificati di collaudo hanno attestato la collaudabilità delle opere

Contenzioso:

Totale riserve definite: 15
Importo totale riserve definite: 0,00
Totale riserve da definire: 0

Note: Il contenzioso instaurato dall'impresa che è sfociato nella richiesta di n.2 lodi arbitrali (12/02/2003-24/10/2007),afferisce non sui lavori di secondo lotto in particolare,ma al contratto a trattativa privata iniziale e a lavori del primo lotto.

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011
