


SCHEMI IDRICI

SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1)

SCHEDA N. 171

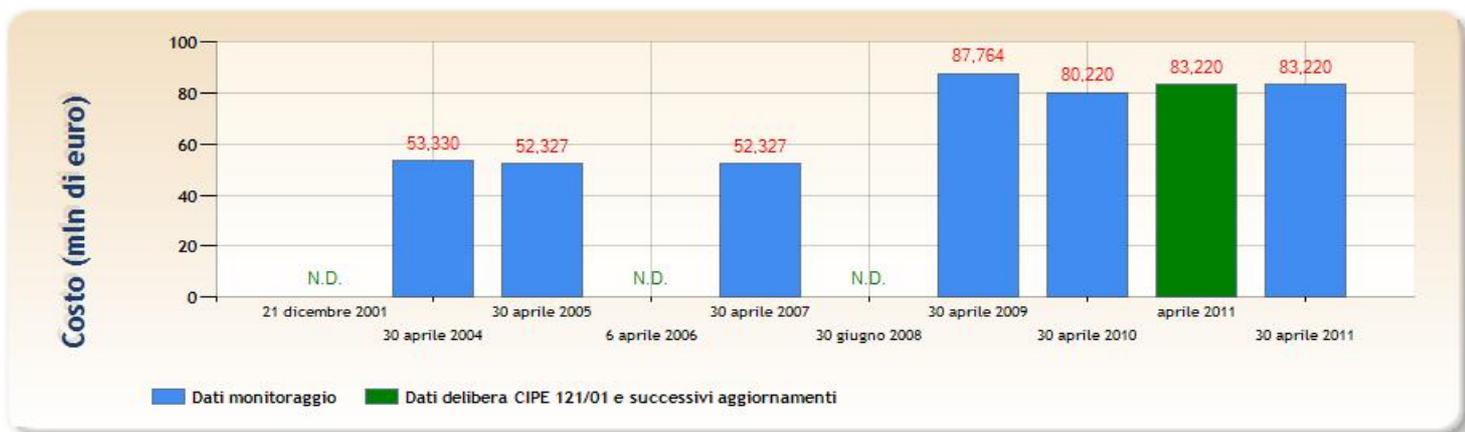

LOCALIZZAZIONE



CUP:

C29J04000010008

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

STATO DI ATTUAZIONE

Progettazione esecutiva

DELIBERE CIPE

48/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

Oltre 2015

DESCRIZIONE

Il progetto "Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori", prevede il completamento della Diga di sbarramento di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari e di valle collegate.

DATI STORICI

1996

Con l'approvazione del progetto esecutivo, in data 12 novembre, viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

2001

L'intervento è compreso nella delibera delibera CIPE n. 121 tra gli "Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare".

2002

L'intervento è inserito nell' APQ di settore del mese di febbraio stipulato tra il MIT e la Regione Sardegna.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro dell'11 ottobre siglata tra Governo e Regione Sardegna. Il soggetto aggiudicatore è individuato nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Un accordo preliminare relativo all'opera viene sottoscritto l'11 novembre dal Commissario governativo per l'emergenza idrica, dall'Associazione Temporanea d'Imprese Dragados Y Construccions P.O.-S.A., Fomento De Construcciones Y Contratas S.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

2003

I lavori di completamento vengono approvati dal Registro Italiano Dighe il 22 settembre.

2004

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale proroga fino al 4 febbraio 2006 la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (CTAR) dei LL.PP. della Sardegna determina il contenzioso relativo alle opere già in atto per un valore di 21,13 Meuro. Con lo stesso voto n. 894 il CTAR della Sardegna dei LL.PP approva, per un totale di 52,38 Meuro, il quadro economico per il completamento dell'opera che costituisce l'aggiornamento del progetto esecutivo originario, tenendo conto dell'impegno assunto dallo stesso Commissario Governativo nell'ambito della risoluzione del contenzioso.

La Regione esprime parere favorevole sulla conformità urbanistica, con nota del 1° marzo, rispetto ai manufatti, che riguardano il territorio dei Comuni di Villa S. Pietro e di Sarroch.

Il MIT, con nota del 12 marzo, trasmette al CIPE la relazione istruttoria proponendo l'assegnazione del finanziamento al progetto esecutivo dell'opera, che rappresenta un primo intervento rispetto a quello definito nella delibera n. 121 a carico delle risorse stanziare della legge n.166/2002.

Il CIPE, con delibera n. 48, prende atto dell'istruttoria del MIT, da cui risulta che il costo delle opere da eseguire è di 52,4 Meuro, di cui 8 per l'IVA e che non è ipotizzabile un ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera. Assegna quindi al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale un contributo quindicennale annuo di 4,8 Meuro, di cui 2,7 a decorrere dal 2005 e 2,1 a decorrere dall'anno 2006. L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui alla legge n.166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualità. Il contributo è comprensivo di IVA solo se il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale non è soggetto a tale imposta e potrà essere erogato successivamente all'attestazione, da parte del Commissario Governativo per l'emergenza idrica al MIT, dell'avvenuta risoluzione del contenzioso.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

L'intervento compare nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS .

Il 2 ottobre 2009 viene sottoscritto l'Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Sardegna, in cui è riportato che l'intervento è finanziato con i fondi della legge obiettivo (52,3 Meuro) e con i fondi del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica (28 Meuro). Nel documento si fa inoltre presente che i lavori sono in fase di riappalto a seguito di rescissione del contratto e che è necessaria una parziale integrazione delle risorse per consentire la realizzazione della condotta pedemontana e per i danni alluvionali verificatisi (complessivamente 20 Meuro).

Con Delibera di Giunta N. 52/8 del 27.11.2009 la Regione Sardegna dispone l'assegnazione di 3,00 Meuro per l'intervento e richiede che la realizzazione venga trasferita dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale all'Ente Acque della Sardegna, secondo modalità e tempi definiti in apposito protocollo tra gli Enti, che tenga conto delle procedure in corso per l'utilizzazione del finanziamento attribuito dal CIPE.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu Is Canargius e bacini minori - lotto 1" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2013 l'opera "Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu Is Canargius e bacini minori - lotto 1" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta completata a marzo 2010 la progettazione esecutiva. La gara d'appalto non è stata ancora avviata a causa di alcuni adeguamenti agli elaborati progettuali che non necessitano di ulteriori approvazioni.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	53,330 Fonte: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
Previsione di costo al 30 aprile 2005	52,327 Fonte: Delibera CIPE 48/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	52,327 Fonte: Delibera CIPE 48/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	87,764 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	80,220 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	83,220 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	83,220 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	83,220 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	83,220
Fondi Legge Obiettivo	52,327 Fonte: Delibera CIPE 48/2004
Fondi Pubblici	27,893 Fonte: Delibera CIPE 48/2004

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 56.601.580,51

Servizio: Interno

Costo progettazione interno:

Data inizio: 01/10/2009

Data fine: 10/03/2010

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura: Procedura aperta

Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

la gara d'appalto non è stata ancora avviata causa chiarimenti con RID in merito ad alcuni adeguamenti di elaborati progettuali che non necessitano di ulteriori approvazioni.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Delibera n. 2695 della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale del 12 Novembre 1996

Accordo di Programma Quadro Risorse idriche del Febbraio 2002

IGQ tra Governo e Regione Sardegna del 11 Ottobre 2002

Accordo preliminare del 11 Novembre 2002

Nota Registro Italiano Dighe n. 1463/UCPL del 22 Settembre 2003

Delibera n. 1068 Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale del 30 Gennaio
2004

Delibera CIPE 48/2004

del 29 Settembre 2004

Atto Aggiuntivo all'IGQ tra Governo e Regione Sardegna del 2 Ottobre 2009

Delibera Regione Autonoma della Sardegna n. 52/8 del 27 Novembre 2009
