


CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA

Strada delle Tre Valli Tratto Eggi-S. Sabino

SCHEDA N. 73

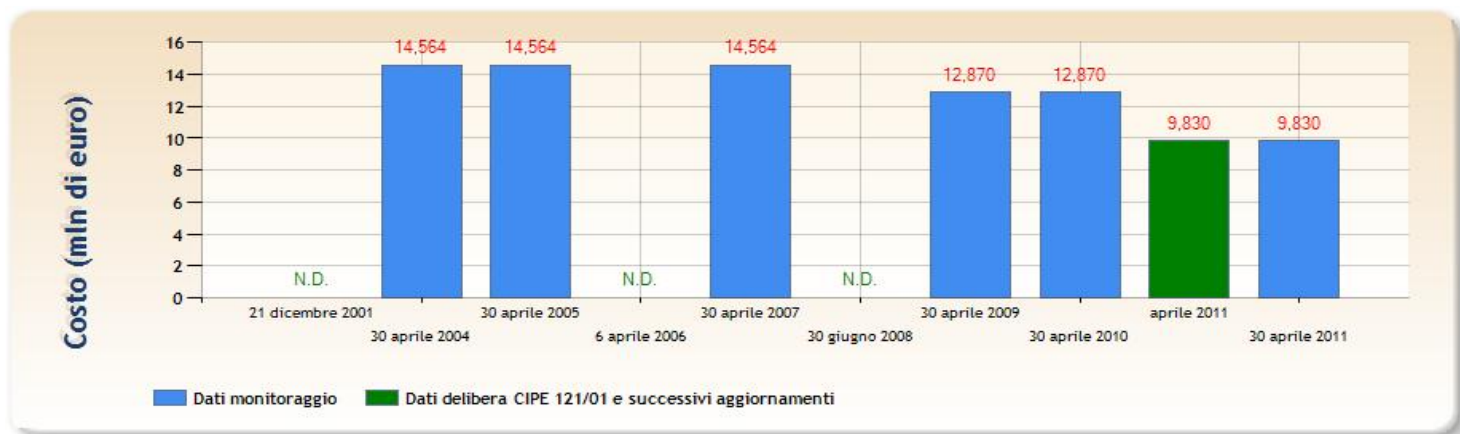

LOCALIZZAZIONE



CUP:

C61B03000260001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

Regione Umbria

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

56/2003

ULTIMAZIONE LAVORI

2011

DESCRIZIONE

Il progetto "Strada delle tre Valli" riguarda, nel suo complesso, il completamento della strada di collegamento fra la S.S. 209 Valnerina e la S.S. 3bis Tiberina. In dettaglio il progetto prevede:

- la realizzazione a quattro corsie – due per ogni senso di marcia - del tratto da Eggi a San Sabino;
- il raddoppio a due corsie – del pari per ogni senso di marcia – nel tratto compreso tra San Sabino e Madonna di Baiano tratto del quale sono già in esercizio le prime due corsie (per ogni senso di marcia);
- la realizzazione, nel tratto Madonna di Baiano e Acquasparta, di due carreggiate, ciascuna a due corsie per senso di marcia.

Il tracciato della Strada delle Tre Valli Umbre, riconducibile alla categoria B (strade extraurbane principali), nel tratto Eggi – Acquasparta, presenta una lunghezza complessiva di 20,893 Km e si sviluppa tra lo svincolo di Eggi sulla S.S. 3 Flaminia e lo svincolo di collegamento alla Strada di grande comunicazione (SGC) Orte – Ravenna.L'intervento riguarda la realizzazione a quattro corsie – due per ogni senso di marcia - del tratto da Eggi a San Sabino, della lunghezza di 3,819 Km, che congiunge due lotti della "Strada delle Tre Valli" già realizzati e in esercizio.

DATI STORICI

2000

La Regione Umbria esprime parere favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento

2001

La CdS, convocata dal MIT, si pronuncia positivamente sul progetto esecutivo il 24 gennaio.La Regione Umbria approva il progetto esecutivo nel mese di settembre.La "Strada Tre Valli" è inserita nella delibera CIPE n. 121 tra i "Sistemi stradali e autostradali".

2002

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Umbria del 24 ottobre.

2003

Il MIT trasmette la relazione istruttoria relativa alla "Strada delle tre valli"-tratto Eggi-S. Sabino del costo di 14,6 Meuro, proponendone il finanziamento a carico della legge n. 166/2002.Il CIPE, con delibera n. 56, prende atto che l'intervento è dotato di progetto esecutivo e che la Regione Umbria ritiene prioritario anticipare la realizzazione del primo tratto a due corsie Eggi-S.Sabino, nelle more dell'approvazione, da parte degli organi competenti, dell'intero tratto Eggi-Acquasparta. Il soggetto aggiudicatore è la Regione Umbria, che potrà avvalersi dell'ANAS mediante apposita convenzione; all'intervento Eggi-S.Sabino è assegnato un contributo di 14,6 Meuro da imputarsi all'anno 2003 a carico delle risorse della legge n.166/2002. L'assegnazione copre il costo complessivo previsto.

2005

L'ANAS pubblica il bando di gara per i "lavori di costruzione del tratto tra lo svincolo di Eggi e San Sabino".

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.L'ANAS pubblica l'avviso relativo all'aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 27 giugno, dei "lavori di costruzione del tratto tra lo svincolo di Eggi e San Sabino" all'impresa Ediltevere Spa.

2007

Il 24 marzo vengono definitivamente consegnati i lavori da ANAS alla Ediltevere Spa.

2008

Il 1 agosto viene sottoscritto il 2° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Umbria. Con tale atto le parti decidono di ribadire l'inserimento della realizzazione della strada delle Tre Valli tra gli interventi della legge n. 443/2001.

2009

L'opera è compresa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Strada Tre valli - Tratto Eggi / S. Sabino" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010". Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Strada Tre valli - Tratto Eggi / S. Sabino" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, l'avanzamento dei lavori è del 76,9%, ma i lavori risultano temporaneamente sospesi per problemi finanziari dell'Impresa. Inoltre risulta prossima la ripresa delle attività di cantiere.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	14,564 Fonte: Delibera CIPE 56/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005	14,564 Fonte: Delibera CIPE 56/2003
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	14,564 Fonte: Delibera CIPE 56/2003
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	12,870 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2010	12,870 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	9,830 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	9,830 Fonte: DEF 2012-2014

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	14,564 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	14,564
Fondi Legge Obiettivo	14,564 Fonte: Delibera CIPE 56/2003

Fondi residui:	-4,734
-----------------------	---------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
--------------	----

Importo lavori:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	700 giorni
Data bando:	28/07/2005
CIG/CUI:	30200648011
Data aggiudicazione:	27/06/2006
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	EDILTEVERE S.P.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00279040547
Data contratto:	20/10/2006

Quadro economico:

Importo a base gara:	9.276.270,80
Importo oneri per la sicurezza:	389.925,00
Importo complessivo a base di gara:	9.666.195,80
Importo aggiudicazione:	7.917.154,98
Somme a disposizione:	4.897.888,71
Totale:	12.815.043,69
% Ribasso di aggiudicazione:	18,86
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	23/02/2009
Stato avanzamento importo:	6.067.761,93
Stato avanzamento percentuale:	76,90
Data effettiva inizio lavori:	26/03/2007
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	02/02/2011
Tempi realizzazione:	In ritardo - problemi finanziari dell'Impresa e successivo affitto del ramo d'azienda inglobante il cantiere. Prossima ripresa delle attività di cantiere.
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	11
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	2
Totale giorni sospensione:	25
Note:	Sospensioni parziali per ritrovamenti archeologici

Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	684
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	Art.132 c.1. lett.b), lett.c) e c.3. D.Lgs.163/2006
Importo:	8.741.774,22
Importo oneri sicurezza:	389.925,00
Somme a disposizione:	2.917.362,44
Totale:	12.049.061,66
Note:	

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Determinazione Regione Umbria n. 2470 del 22 Marzo 2000

Determinazione dirigenziale Regione Umbria n.8029 del 7 Settembre 2001

IGQ tra Governo e Regione Umbria del 24 Ottobre 2002

Delibera CIPE 56/2003 del 25 Luglio 2003

Bando di gara ANAS Spa del Agosto 2005

Avviso di aggiudicazione ANAS Spa del Settembre 2006

2° Atto integrativo all'IGQ Regione Umbria del 1 Agosto 2008
