


CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA

Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"


SS 106 Jonica

Megalotto 4 - Tratto 9° - Variante di Nova Siri, tra i km 414+080 e km 419+300
(quattro corsie)

SCHEDA N. 81

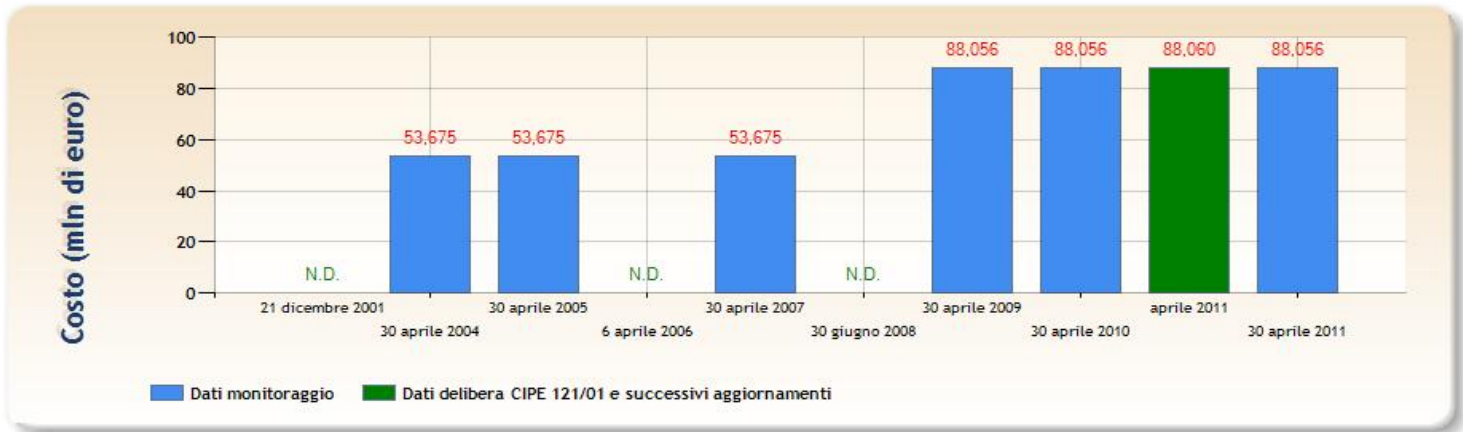

LOCALIZZAZIONE

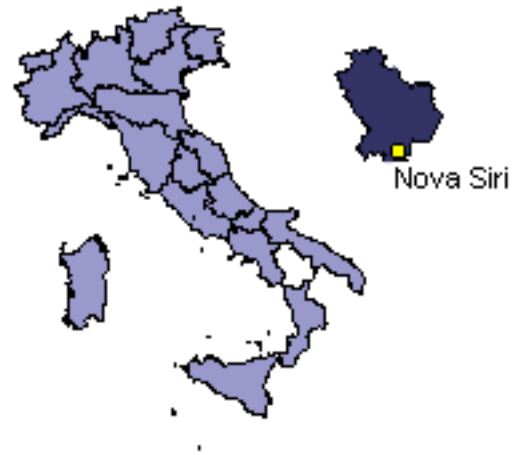

CUP:

F82C06000010001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

ANAS Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Opere con esecutore individuato

DELIBERE CIPE

91/2009
165/2007
20/2009

ULTIMAZIONE LAVORI

2013

DESCRIZIONE

La Strada Statale "Jonica" ha un'estensione complessiva, da Taranto a Reggio Calabria, di 491 chilometri di cui 39 chilometri nella regione Puglia, 37 chilometri nella regione Basilicata e 415 chilometri nella regione Calabria.

La nuova S.S. 106 "Jonica" sarà completamente integrata con l'Autostrada Salerno - Reggio Calabria mediante la realizzazione di arterie trasversali di collegamento come la S.S. 182 "delle Serre", già in parte in esecuzione, e la S.S. 534 per la quale è in fase di progettazione definitiva l'ammodernamento e adeguamento alla sezione tipo B come collegamento autostradale (Megalotto 4) tra lo svincolo di Firmo (autostrada A3) e Sibari.

Gli interventi previsti per la realizzazione della "nuova Jonica" fuori sede, nella regione Calabria, attualmente in progettazione, sono costituiti complessivamente da 12 Megalotti - alcuni dei quali già affidati ed altri da affidare a Contraente Generale - e da ulteriori interventi affidati e da affidare tramite appalto integrato per un investimento totale stimato di circa 16 miliardi di euro.

Il progetto approvato dal CIPE in esame riguarda l'ammodernamento a 4 corsie del tratto di SS 106 che attraversa l'abitato di Nova Siri e che lo aggirerà ad ovest mediante una variante che si distacca dal tracciato esistente in prossimità del torrente S. Nicola. Lo sviluppo complessivo del tracciato è di circa 5 km dei quali 1,7 Km in Calabria e la restante parte in Basilicata. La nuova strada è di categoria B (2 corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale, e banchine laterali). Lungo il tracciato principale sono presenti 4 viadotti e 2 svincoli: "Nova Siri Sud" e "Nova Siri Scalo".

DATI STORICI

2001

Nella delibera CIPE n. 121 l'intervento è incluso nella voce "Sistemi stradali ed autostradali - Corridoio jonico Taranto – Sibari – Reggio Calabria" e, in particolare, nella voce "Corridoio jonico: tratta lucana Taranto – Reggio Calabria (adeguamento SS 106, tratta Nova Siri – Metaponto) di cui all'allegato 2.

2002

Il 27 aprile il Comune di Rocca Imperiale esprime un parere con prescrizioni e raccomandazioni. L'opera rientra nelle IGQ tra il Governo e le Regioni Calabria e Basilicata siglate in corso d'anno.

2003

Il progetto preliminare viene approvato, in linea tecnica, dal CdA dell'ANAS in data 17 aprile. Il 28 maggio l'ANAS, in qualità di soggetto aggiudicatore, presenta il progetto al MIT e lo trasmette agli altri Ministeri interessati ed ai servizi competenti delle Regioni Calabria e Basilicata, dandone inoltre "avviso pubblico" su due giornali quotidiani.

2004

Il 3 giugno il Ministero dell'ambiente, trasmette il parere positivo, con prescrizioni e raccomandazioni, della Commissione VIA. Il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 23 dicembre, formula parere positivo, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni.

2005

La Regione Basilicata, con nota del 17 ottobre, trasmette la delibera con la quale la Giunta regionale formalizza il parere favorevole all'intesa in ordine alla localizzazione del progetto, condizionato all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni. Successivamente la Regione Calabria trasmette la delibera consiliare del Comune di Rocca Imperiale e formula parere favorevole all'intesa in ordine alla localizzazione del progetto, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella citata delibera comunale.

2006

L'opera è contemplata dalla delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS. Il 21 marzo il MIT trasmette al CIPE la relazione istruttoria sul progetto preliminare dell'intervento "SS 106 Jonica – adeguamento alla cat. 'B' del D.M. 5 novembre 2001 – variante di Nova Siri tra i Km 414+080 e 419+300", proponendone l'approvazione con prescrizioni e raccomandazioni, ai soli fini procedurali. Il CIPE, con delibera n. 91 del 29 marzo, approva il progetto preliminare e chiede che il progetto definitivo riporti una dettagliata articolazione degli oneri per indagini archeologiche e per opere compensative al fine di definire il finanziamento a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma.

2007

Il "Contratto di programma ANAS 2007", approvato dal CIPE con delibera n. 65, all'allegato A riporta il piano degli investimenti da realizzare nell'arco temporale 2007-2011 e include l'intervento nella tabella relativa agli interventi di "legge obiettivo" con un costo lievemente inferiore e con appaltabilità 2009. Il MIT, con nota del 18 dicembre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria relativa all'intervento. Il 20 dicembre il MIT precisa che la variante di Nova Siri è riconducibile alla SS 106 Jonica, per la quale non è prevista alcuna ipotesi di pedaggiamento e allega il piano economico finanziario sintetico, indicando le risorse su cui imputare il contributo richiesto. Il CIPE, con delibera n. 165 del 21 dicembre, assegna il contributo di 715.552 euro a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 977, della L. 296/06, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2008 e un ulteriore contributo di 163.471 euro, imputato sui fondi di cui al citato comma 977, per 14 anni, a decorrere all'anno 2009. Tali contributi sono suscettibili di sviluppare un volume di investimenti complessivo di 9,24 Meuro.

2008

In gennaio viene pubblicato l'avvio del procedimento di pubblica utilità su tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale. Il 1° luglio il Ministero per i beni culturali esprime parere favorevole con prescrizioni. Successivamente le Regioni Calabria e Basilicata esprimono il proprio parere, relativo alle IGQ siglate con il Governo, sulla localizzazione. Il Ministero dell'ambiente, in data 30 dicembre 2008, esprime parere favorevole.

2009

L'opera è contemplata nella delibera CIPE n. 10, di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS. Il CdA ANAS, il 24 aprile, approva il progetto definitivo per l'appalto integrato dei lavori di costruzione della variante di Nova Siri sulla S.S. 106 Jonica, nelle province di Matera e Cosenza. L'investimento complessivo del progetto è di oltre 88 Meuro, di cui 53,6 Meuro sono già finanziati. Il CIPE, con delibera n. 20, approva il progetto definitivo della variante di Nova Siri della S.S. 106 Jonica, che prevede lavori di adeguamento della sezione stradale alla categoria B1, con assegnazione di un finanziamento di 34,33 Meuro a valere sul Fondo Infrastrutture di cui alla delibera CIPE n. 112/2008. Il MIT, con nota 7 aprile 2009, chiede al CIPE l'iscrizione all'odg della prima seduta utile dell'argomento "SS Jonica – variante di Nova Siri – progetto definitivo", trasmettendo la relativa relazione istruttoria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota 8 aprile 2009, imputa l'assegnazione di un maggiore contributo di 34,381 Meuro per la "SS 106 Jonica – variante di Nova Siri" a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto legge n. 112/2008. Il 1° giugno l'ANAS pubblica il bando di gara relativo all'affidamento dell'appalto integrato per la costruzione della Variante di Nova Siri con adeguamento della Sezione Stradale alla categoria B1 (D.M. 5.11.2001) tronco 9° (dalla km.ca 414+080 alla km.ca 419+300) della S.S. N° 106 Jonica nei Comuni di Nova Siri (MT), Rotondella (MT) e Rocca Imperiale (CS). L'aggiudicazione della gara è subordinata all'effettivo reperimento dei fondi necessari. L'UE, con Decisione C(2009) 5299 del 30 giugno, prevede la variazione della copertura finanziaria di 158.685.678 del GP S.S. 114 da fondi ANAS a fondi PON-Trasporti 2000-2006 e conseguentemente la stessa variazione di 158.685.678, prima utilizzati a copertura dei Progetti "PON in riutilizzo" (tra i quali la Variante di Nova Siri) da fondi PON-Trasporti 2000-2006 a fondi ANAS. Con D.P.C.M. 5 agosto 2009 viene nominato Commissario straordinario per l'opera l'ing. Roberto Viviani.

2010

Il 24 febbraio, audito dall'VIII Commissione della Camera, il Commissario, relazionando sullo stato dell'opera, fa sapere che si è conclusa la prequalifica delle imprese ed è in corso la fase di gara.

Ad ottobre ANAS aggiudica in via definitiva l'appalto integrato all'ATI composto da Oberosler Cav. Pietro Spa (capogruppo) con So.Ve.Co. Spa.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera " S.S. 106 - Tratto 9° Variante di Nova Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2014 l'opera " S.S. 106 - Tratto 9° Variante di Nova Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, si rileva che l'avvio dei lavori è programmato per ottobre 2011 e il completamento per luglio 2013.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	53,675 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 30 aprile 2005	53,675 Fonte: Corte dei Conti
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	53,675 Fonte: Delibera CIPE 91/2006
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	88,056 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 30 aprile 2010	88,056 Fonte: Delibera CIPE 20/2009
Costo ad aprile 2011	88,060 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	88,056 Fonte: Delibera CIPE 20/2009

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	88,050 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	88,056
ANAS Spa	44,433 Fonte: Delibera CIPE 20/2009
Fondi Legge Obiettivo	9,242 Fonte: Delibera CIPE 20/2009
Fondo Infrastrutture	34,381 Fonte: Delibera CIPE 20/2009

Fabbisogno residuo: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa

Note: Il Progetto Esecutivo è stato redatto dall'A.T.I. aggiudicataria anche dei lavori (Appalto Integrato). Con OdS n° 1 del 07/12/2010 è stato disposto l'inizio della progettazione esecutiva. In data 04/05/2011 l'A.T.I. ha consegnato il Progetto Esecutivo all'ANAS SpA. Si prevede di approvare il Progetto esecutivo entro il 11/07/2011. L'importo dei lavori (al netto degli Oneri per la Sicurezza e degli oneri per la Progettazione Esecutiva), risultante dal Progetto Esecutivo consegnato il 04/05/2011, è pari ad € 34.983.947,87

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 34.983.947,87
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 806.007,15
Importo di aggiudicazione: 467.484,15
Nome aggiudicatario: A.T.I. OBEROSLER CAV. PIETRO S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 01286010226
Data inizio: 07/12/2010
Data fine: 04/05/2011

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 150 giorni
Lavori: 650 giorni
Data bando: 24/12/2008
CIG/CUI: 0326487198
Data aggiudicazione: 25/10/2010
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: OBEROSLER CAV. PIETRO S.p.A - SO.VE.CO S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario: 01286010226
Data contratto: 24/11/2010

Quadro economico:

Importo a base gara: 60.037.563,31
Importo oneri per la sicurezza: 1.962.986,73
Importo complessivo a base di gara: 62.000.550,04
Importo aggiudicazione: 37.414.418,75
Somme a disposizione: 25.249.451,59
Totale: 62.663.870,34
% Ribasso di aggiudicazione: 41,73
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: QUADRO ECONOMICO- L'importo complessivo a base di gara è stato inserito al netto degli oneri per la progettazione esecutiva (€ 806.007,15) - Le somme a disposizione sono comprensive degli oneri di investimento (€ 11.485.566,36). Pertanto il totale calcolato dal sistema pari ad € 87.250.001,63 risulta essere al netto dell'importo per la progettazione esecutiva a base di gara di € 806.007,15.
- QUADRO FINANZIARIO- Delibera CIPE n. 91 del 29/03/2006 pari a M€ 9,242; delibera CIPE n. 20 del 08/05/2009 pari a M€ 34,33; fondi ANAS pari a M€ 44,433

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori: 10/10/2011

Data presunta fine lavori: 20/07/2013

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note: Commissione di collaudo nominata da ANAS- DG.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Delibera Consiliare Comune di Rocca Imperiale n. 11 del 27 Aprile 2002

IGQ tra Governo e Regione Calabria del 16 Maggio 2002

IGQ tra Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002

Delibera ANAS Spa n. 38 del 17 Aprile 2003

Delibera Regione Basilicata n. 2054 del 11 Ottobre 2005

Delibera CIPE 91/2006 del 29 Marzo 2006

CdP ANAS Spa del 2007

Delibera CIPE 65/2007 del 20 Luglio 2007

Delibera CIPE 165/2007 del 21 Dicembre 2007

Delibera di Giunta Regione Calabria n. 601 del 12 Agosto 2008

Delibera di Giunta Regione Basilicata n. 1524 del 30 Settembre 2008

Delibera CIPE 20/2009 del 8 Maggio 2009

Bando di gara ANAS Spa del 1 Giugno 2009

DPCM del 5 Agosto 2009

Relazione per la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati – Audizione Ing.

Roberto Viviani, Commissario Straordinario Delegato per la Strada Statale 106 Jonica del 24 Febbraio 2010

Avviso di aggiudicazione ANAS Spa del Ottobre 2010
