


SCHEMI IDRICI

BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)

2° lotto: completamento della ristrutturazione del sistema di adduzione

SCHEDA N. 155

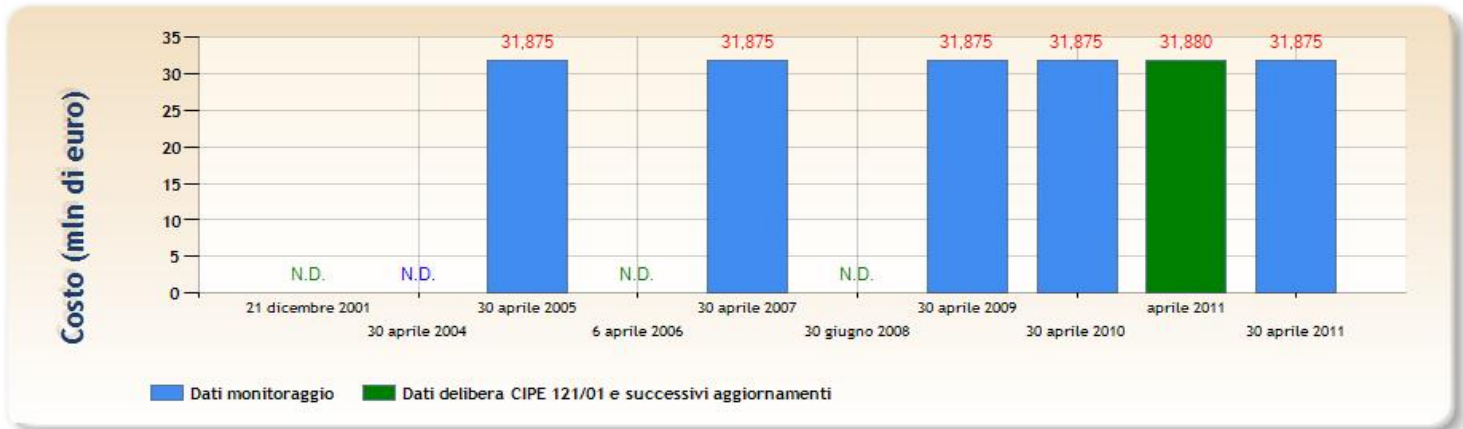

LOCALIZZAZIONE



CUP:

G87H04000030001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete idrica

SOGGETTO TITOLARE:

Ente Irrigazione Puglia Lucania ed
Irpinia di Bari

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

DELIBERE CIPE

113/2004

ULTIMAZIONE LAVORI

2008

DESCRIZIONE

Il progetto prevede l'intubamento dell'adduttore Bradano, da Masseria Castrignano alla vasca terminale del sifone Acquafetente, per circa 8,5 km e dell'adduttore San Marco Venella, per circa 9,4 Km con tubazioni in acciaio del diametro variabile da 2400 mm a 600 mm, la ristrutturazione del canale a pelo libero, dalla vasca terminale sopra citata al nodo di Girifalco, per circa 1,4 Km, la ristrutturazione della galleria iniziale dall'invaso di San Giuliano al Ponte Santa Lucia e infine le opere accessorie per garantire maggiore funzionalità e sicurezza alle opere stesse.

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata.

2002

L'opera è compresa nell'intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Basilicata sottoscritta il 20 dicembre.

2003

L'Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari pubblica il bando di gara per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano in agro di Ginosa, Montescaglioso e Matera: realizzazione di condotta in acciaio Ø 1800, di opere di regolazione in c.a., rimozione e allontanamento a discarica autorizzata di vecchie condotte in c.a.p", dell'importo complessivo pari a 18,3 Meuro.

2004

Il MIT, con nota del 22 luglio, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sulla "Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano Vinoso-lotto secondo-Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03", proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziare dalla legge n.166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003.

Con la delibera n. 19, il CIPE ripartisce le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 riservando 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS e 288 Meuro alla "sicurezza", di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione del PIS.

Con la delibera n. 21, il CIPE finalizza i 1.130 Meuro della delibera n. 19 – al netto di 23 Meuro destinati alla premialità – ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal MIT, destinandoli al finanziamento - secondo la graduatoria – di alcuni interventi, tra cui figura anche, al 15° posto, l'opera "Ristrutturazione adduttore idraulico di S.Giuliano-Ginosa: completamento opere principali di cui al progetto BAS 03", con un costo di 31,9 Meuro.

L'Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari, il 14 settembre, aggiudica l'appalto dei "Lavori di ristrutturazione dell'adduttore idraulico S.Giuliano-Ginosa, Montescaglioso e Matera", dell'importo complessivo di 18,3 Meuro, all'impresa Vitaliani e Randich Spa, poi Vitaliano Spa per cessione ramo d'azienda.

Il CIPE, con delibera n. 113, approva, con prescrizioni, il progetto definitivo della "Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S.Giuliano-Ginosa-lotto secondo-Completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03" e finanzia interamente l'opera.

2006

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, in data 28 ottobre, dopo una prima proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, comunica la sospensione del procedimento fino alla definizione del relativo

finanziamento e fa presente che con successivo provvedimento saranno adottate ulteriori determinazioni sulla riapertura dei termini di gara. Il Consorzio di bonifica, soggetto aggiudicatore, che ha proceduto alla contrazione del mutuo ed all'avvio delle procedure di gara sulla base del progetto definitivo, fa presente che, pur in presenza della convenzione tra regione Basilicata ed il Consorzio, risulta complessa l'erogazione di un mutuo della Cassa DD.PP. ad un ente divenuto privato con la legge finanziaria 2005.

2009

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S.Giuliano - Ginosa (lotto 2)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S.Giuliano - Ginosa (lotto 2)" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, i lavori risultano conclusi in data 23 dicembre 2008

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	31,875 Fonte: Delibera CIPE 113/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	31,875 Fonte: Delibera CIPE 113/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	31,875 Fonte: Delibera CIPE 113/2004
Previsione di costo al 30 aprile 2010	31,875 Fonte: Delibera CIPE 113/2004
Costo ad aprile 2011	31,880 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	31,875 Fonte: Delibera CIPE 113/2004

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	31,870 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	31,875
Fondi Legge Obiettivo	31,875 Fonte: Delibera CIPE 113/2004

Fabbisogno residuo:	0,000
----------------------------	--------------

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: No
Importo lavori:
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 618.897,63
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 24/12/2003
CIG/CUI: 16200460599
Data aggiudicazione: 22/07/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Vitaliani & Randich - Roma
Codice fiscale aggiudicatario: 05207560581
Data contratto: 29/12/2004
Quadro economico:
Importo a base gara: 17.674.704,46
Importo oneri per la sicurezza: 670.051,18
Importo complessivo a base di gara: 18.344.755,64
Importo aggiudicazione: 11.670.468,65
Somme a disposizione: 6.627.573,49
Totale: 18.298.042,14
% Ribasso di aggiudicazione: 37,76
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori: 23/12/2008

Data presunta fine lavori varianti:**Tempi realizzazione:** Secondo previsione**Data collaudo statico:** 15/07/2009**Data collaudo tecnico-**
amministrativo: 23/09/2009**Note:**

Ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo T.A. (Decreto Commissariale n° 952 del 10/12/2009) il quadro economico è il seguente:
Lavori come da S.F. confermato dalla comm. Coll. €. 16.029.539,30
Equo compenso €. 1.100.944,30
Oneri di sicurezza €. 985.679,35
Anticipazioni appaltatore (O.d.S. del 18/12/2007) €. 2.900
Sommano €. 18.119.063,03
Somme a disposizione €. 6.853.266,10 di cui €. 576.478,09 per compensazione costi materiali ("caro ferro").

Contenzioso:**Totale riserve definite:****Importo totale riserve definite:****Totale riserve da definire:** 12**Note:**

A conclusione dei lavori La Commissione nominata ex art. 240 D.lgs. 163/2006 non ha raggiunto un parere concorde utile alla definizione del contenzioso. E' pendente giudizio instaurato dall'appaltatore innanzi la competente Autorità giudiziaria.

Sospensione lavori:**Numero totale:** 1**Totale giorni sospensione:** 170**Note:**

Con verbale in data 18/09/2006 venne disposta la sospensione parziale dei lavori per redazione di perizia suppletiva e di variante.

Varianti:**Numero totale:** 2**Giorni proroga totali:** 490**Motivi:****Altri motivi:**

Del maggior tempo contrattuale di 490 gg., 300 gg. (120+180) sono stati concessi per i maggiori lavori di cui alle perizie di variante e 190 (180+30) su istanza dell'impresa.

Importo: 16.853.879,15**Importo oneri sicurezza:** 1.036.369,18**Somme a disposizione:** 7.082.080,80**Totale:** 24.972.329,13**Note:**

Le somme a disposizione comprendono anche l'importo di €. 1.100.944,30 per "equo compenso" sui maggiori lavori di cui alla perizia n° 2, eccedenti il 6°/5°.

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Delibera CIPE 19/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004

del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 113/2004

del 20 Dicembre 2004

Bando di gara Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera del 30 Giugno 2006
